MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAP. 10 · ØKT 3 AV 3

Markedsplanen: gjennomføring og evaluering

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Kapittel 10 går over tre økter: analyse, mål og strategi; handlingsplanen og budsjettet; gjennomføring og evaluering. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, solcelle- og ladeavdelingen.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 10 svarer på tre spørsmål, i tre økter

1 Er Karis lapp en markedsplan?

Analyse, mål og strategi

Punkt 1–4: forretningsidé og tre valg, situasjonsanalyse, mål i kroner og dekningsbidrag, fem virkemidler.

Økt 1 · boka 10.1–10.4

2 Hvem gjør hva, når, for hvor mye?

Handlingsplan og budsjett

Punkt 5: uke, aktivitet, mål, budsjett og ansvarlig. Og om planen bærer seg.

Økt 2 · boka 10.5

Denne økta

3 Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Gjennomføring og evaluering

Punkt 6–7: ansvar, fast strategi og fleksibel taktikk, milepæler og fire utfall.

Økt 3 · boka 10.6–10.7

Én figur holder hele kapitlet sammen: de sju punktene, i fast rekkefølge



Punkt 1–4 har dere laget i kapittel 3 og 5–9. Punkt 5–7 er det nye. Ingen mål før analysen, ingen tiltak før målene.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Markedsplan	Markedsdelen av forretningsplanen, salgsplan	Hele planen, fra analyse til evaluering
Situasjonsanalyse	SWOT, styrker og svakheter, muligheter og trusler	Hvor bedriften står, internt og eksternt
Markedsmål	Salgsmål, budsjettmål, KPI (nøkkeltall for måloppnåelse)	Tallfestet mål med frist og ansvarlig
Handlingsplan	Aktivitetsplan, kampanjeplan, tiltaksliste med eier og frist	Hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye
Milepæl	Statusmøte, kontrollpunkt, oppfølgingspunkt	Avtalt sjekk underveis med tall
Prisdifferensiering	Kvantumsrabatt, prosjektpris, rammeavtalepris	Ulik pris til ulike kundegrupper for samme ytelse
Dekningsbidrag	DB, timebidrag (DB per time)	Det som er igjen når materiell og montørtimer er betalt

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Uke 12, 26. mars: bare 4 av 10 styrebesøk er gjort

Milepæl uke 12: styrebesøk gjort

4 av 10

Planen sa ti. To styrer svarte aldri i uke 7.

Frist for kontrakten

30. juni

Delmål 1.3: felles ladeanlegg, minst 20 plasser. 14 uker igjen, og generalforsamlingen må vedta.

Rammen for planen

40 400 kr

Ni linjer, 78 administrasjonstimer, 14 montørtimer og 5 900 kr i utlegg.

I dag: punkt 6 og 7, det som skjer etter at planen er skrevet



Spørsmålet for økta: hva gjør Kari nå, og hvordan vet hun i juni om planen var vellykket?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du følge en plan uke for uke og evaluere resultatet

1 Lede gjennomføringen

Vite hvem som har ansvaret, og skille det som ligger fast fra det som kan endres.

2 Bruke milepæler

Se avvik mens det er tid, og justere taktikken uten å forkaste strategien.

3 Evaluere

Mål og ramme: fire utfall, fire spørsmål når målet ikke nås, og hva en overoppfylling betyr.

Du trenger ikke

Å kunne Bygghandels tall utenat eller lage selve annonsen. Du skal kunne skrive planen styret sier ja til, og følge den opp.

Hvorfor det haster

Forretningsplanen i Etablering av el-bedrift og markedsstrategien for Kruttverket er denne planen. Uten uke, navn og sum er den en lapp.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Ansvaret	Fast eller fleksibelt	Milepæler	Billig eller vellykket	Fire spørsmål	Stopp: 1C	Fasit	Samtale	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Punkt 6: ansvaret: hvem sørger for at planen blir gjort?

Begrepet

Styret og daglig leder har det øverste ansvaret for at planen settes i verk. Markedssjefen har det daglige ansvaret (10.6). Gjennomføringen trenger også ressurser: nok penger og nok folk, ellers skjer det ikke. En plan uten navn på ansvaret er ingens plan.


Regelen

Øverste ansvar: styret og daglig leder.
Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person når bedriften ikke har en.

I jobben

I en liten bedrift er det sjelden en markedssjef. Da må rollen stå på et navn, og den personen må få tid til den.

Ansvaret hos Nordlys

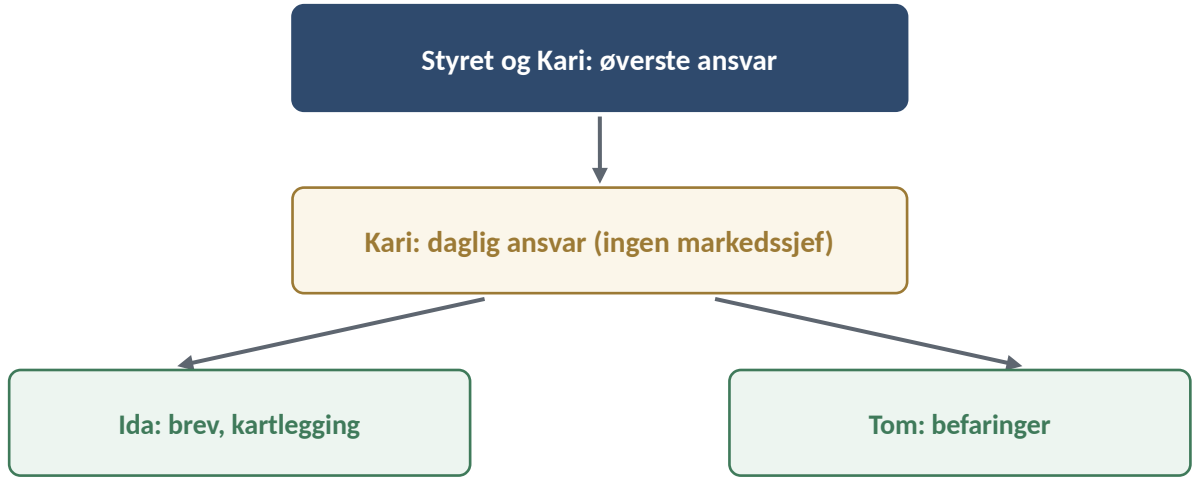

Hos Nordlys

Kari har det daglige ansvaret i tillegg til å være daglig leder og installatør. Det er Karis tid som er knapp, og det er grunnen til at bare 4 av 10 besøk er gjort i uke 12.

Husk **Et navn på ansvaret, og tid til å bære det.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

BEGREP

Strategi fast, taktikk fleksibel: hva kan Kari endre underveis?

Begrepet

Strategien skal få tid til å virke og endres bare når rammene endres radikalt. Taktikken, altså hvordan aktivitetene gjennomføres, skal kunne endres når noe uforutsett skjer. Boka kaller det beredskap for improvisasjon. Det viktigste er ikke å følge planen til punkt og prikke, men at målet nås (10.6).

Regelen

Strategien ligger fast: mål og målgruppe.
Taktikken kan endres: hvem, hvordan, i hvilken rekkefølge.

I jobben

Improvisasjon er ikke en unnskyldning for å droppe planen. Målet og målgruppen står; det er veien dit som justeres.

To hendelser hos Nordlys

Hendelse	Ligger fast	Endres
Uke 7: to styrer svarer aldri	Ti besøk, borettslag	Kari ringer to andre på lista
Uke 12: bare 4 av 10 besøk gjort	Kontrakt innen 30. juni	Tom tar fire besøk; Ida tar mer av anbudskalkylen

Målet var ti besøk, ikke ti bestemte styrer.

Hos Nordlys

Hadde Kari skrevet om hele planen i uke 7, ville hun forkastet strategien for to styrer. Hadde hun ventet til uke 26, ville juni kommet som en overraskelse.

Husk **Målet står. Veien dit kan endres.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

BEGREP

Punkt 7: milepæler: hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Begrepet

Evalueringen skjer ikke bare til slutt. Milepæler underveis viser om bedriften er i rute mens det ennå er tid til å justere (10.7). En milepæl er en avtalt sjekk med et tall og en uke, satt inn i planen på forhånd. Sluttevalueringen ser på både resultatet og prosessen.


Regelen

Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker.
Avvik ved en milepæl → juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen.

I jobben

Sett milepælene der et avvik fortsatt kan rettes. En milepæl uken før fristen er bare en kunngjøring.

Milepælene i Nordlys' plan



Uke 12 avslører avviket, 14 uker før fristen. Uke 16: forespørsel om kapasitet til nettselskapet før tilbudet.

Hos Nordlys

Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr (4 timer × 327,43). Det er den styret ville kutte. Uten den hadde Kari oppdaget avviket i juni.

Husk **Resultatet i juni skal ikke komme som en overraskelse.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

BEGREP

Billig eller vellykket: fire utfall av samme plan

Begrepet

En plan vurderes på to ting samtidig: ble målet nådd, og skjedde det innenfor rammen? Vellykket er begge deler (9.11). Å bruke lite er ikke vellykket hvis målet glipper. Og når målet overoppfylles, spør boka om ambisjonsnivået var for lavt (10.7). Evaluer både resultatet og prosessen, og lær av det som virket.

Regelen

Vellykket = målet nådd + innenfor rammen.
Under budsjett uten mål er ikke vellykket.

I jobben

Når en jobb gikk under budsjett, spør du først om den ble ferdig og god. Når den gikk mye bedre enn planlagt, spør du om planen var for forsiktig.

Fire utfall for ladeanlegget, ramme 40 400 kr

Utfall	Kostnad	Vurdering
A: én kontrakt i uke 20	38 000	Målet nådd innenfor rammen
B: én kontrakt	46 000	Målet nådd, rammen sprakk
C: ingen kontrakt	31 000	Under budsjett, målet ikke nådd
D: tre kontrakter	40 000	Overoppfylt: var målet for lavt?

Hos Nordlys

B sprakk med 46 000 − 40 400 = 5 600 kr; ofte er det timene. C brukte 9 400 kr mindre enn rammen, men uten kontrakt er de 31 000 kronene tapt. Utfallene er casetall.

Husk **Billig er ikke det samme som vellykket.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

BEGREP

Fire spørsmål: hva spør Kari når målet ikke nås?

Begrepet

Når et mål ikke nås, peker boka på fire mulige årsaker, én for hvert av virkemidlene (10.7): feil målgruppe, for svakt produkttilbud, prisdifferensieringen dårlig utnyttet, eller kommunikasjonen sviktet. Spørsmålene leder tilbake til markedsstrategien i punkt 4.

Regelen

Feil målgruppe (kap. 5)? Svakt produkt (kap. 6)?
Prisen dårlig brukt (kap. 7)? Kommunikasjonen sviktet (kap. 9)?

I jobben

Still spørsmålene før du konkluderer. «Kundene ville ikke» er sjelden hele svaret.

Utfall C hos Nordlys: ingen kontrakt

Spørsmål	Hva Kari ser etter
Feil målgruppe?	Var borettslagene for små, eller uten elbiler ennå?
For svakt produkt?	Manglet trinnvis utbygging eller drift etterpå?
Prisen dårlig brukt?	Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet?
Kommunikasjonen?	Fikk styret svar på spørsmålene på befaringen?

Hos Nordlys

Spørsmålene leder tilbake til punkt 4. Svaret blir bedre mål og en bedre plan for neste periode, kanskje med andre styrer eller et annet tilbud.

Husk **Spør fire ganger før du konkluderer.**

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp 1: hele markedsplanen for solcelle og lading på én side

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Malen har alle sju punkter. Skriv forretningsidéen og velg vekststrategi. Skriv situasjonsanalysen med tall. Skriv hovedmålet og delmål 1.3 med tall, frist og ansvarlig. Sorter fem tiltak på de fem leddene. Regn handlingsplanens sum. Velg hva Kari gjør i uke 7 og uke 12, og sorter fire utfall. Skriv til slutt hva lappen manglet.

Slik vet du at du er i mål

Alle feltene fylt, og sjekken sier «Bra» eller «Riktig» på hvert: fem grønne på leddene, 40 400 kr, og fire grønne på utfallene.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: planen Kari tar med til styret, og hva lappen manglet

Punkt 1–3

Markedsutvikling

Samme montør etterpå. Fire ruter med tall. + 20 % innen 31.12. og 20 plasser innen 30.6., Kari

Punkt 4–5

40 400 kr

Borettslag, felles anlegg, kvantumsrabatt, Polarlys, brev og besøk. Ni linjer

Punkt 6

Ring to andre

Kari har det daglige ansvaret. Uke 12 med 4 av 10: juster nå

Punkt 7

A · B · C · D

Nådd innenfor rammen, rammen sprakk, ikke nådd, overoppfylt

Lappen manglet analysen, frist og ansvarlig på målet, uke, navn og budsjett på hvert tiltak, en sum styret kan si ja til, og milepæler.

Du er her

Analyse, mål, strategi | Handlingsplan | **Gjennomføring**

SAMTALE

Samtale: markedsplanen i prosjektet ditt

I par · 8 minutter · to par deler etterpå

1

Hvilke av de sju punktene har dere?

Se på markedsdelen i prosjektoppgaven eller planen i bedriften. Hvilke punkter mangler helt?

2

Har målene tall, frist og navn?

Skriv ett mål om slik at det har alle tre. Hva blir det i dekningsbidrag?

3

Hvor ville dere satt en milepæl?

Hvilken uke, hvilket tall, og hvem sjekker? Hva gjør dere hvis tallet ikke er nådd?

Uten uke, navn og sum er en markedsplan en lapp.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 10 på ett ark: sju punkter, tre spørsmål

Er Karis lapp en markedsplan?

Punkt 1–4

Forretningsidé og tre valg, analyse med tall, mål i kroner: delmålene 4 443 360 kr, ekstra dekningsbidrag 139 200 kr. Fem ledd for borettslagene.

Hvem, når, hvor mye?

Punkt 5

Ni linjer med uke, navn og kroner: 40 400 kr, 85 % av det timer. 29,0 % av gevinsten; 64 000 kr igjen ved 75 %.

Hvordan vet Kari i mars?

Punkt 6–7

Kari har ansvaret. Strategien fast, taktikken fleksibel. Milepæl i uke 12. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.



Analyse før mål, mål før tiltak, milepæler før evaluering.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 (gjennomføring) og 10.7 (evaluering). Repeter evalueringen av kampanjer i kapittel 9.11.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Dette kan du bli spurt om

Forklar hvem som har ansvaret for gjennomføringen. Forklar «strategien ligger fast, taktikken endres». Forklar milepæler og hvorfor de settes på forhånd. Vurder fire utfall mot mål og ramme. Nevn de fire spørsmålene når målet ikke nås.

Det viktigste fra økta: milepælene gjør at juni ikke kommer som en overraskelse. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 10: de sju punktene, 10.1–10.7, tabell 10.1 og Bygghandel AS. Kapittel 3, 5–9 og 9.11	Begrepene, reglene og eksempelet
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 (640 kr per montørtime) og kapittel 7 (dekningsbidrag)	Timesatsene og dekningsbidraget
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: administrasjonens lønnskostnad 2 220 000 kr, 1 695 timer, timepris 890 kr, materialpåslag 20 %, solcelleanlegg 58 060 kr og 11 100 kr, ladepunkt 9 580 kr og 1 800 kr. Fjell Elektro AS: 40 000 kr til markedsføring	Alle Nordlys- og Fjell-tall
Casetall fra Markedsføring kapittel 3 og 9: 34 anlegg og 180 ladepunkt i fjor, mål 30 og 282, felles ladeanlegg (415 300 kr, 82 500 kr). Konstruert for kapitlet: handlingsplanens ni linjer, milepælene, de fire utfallene, Fjells plan på 37 840 kr	Hele Nordlys-planen, 1A–1C
Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025 (hentet 14.10.2026). NHO Elektro, innspill om solkraft på tak, 15.04.2026: om lag 70 % ned i første del av 2026. Smarte Penger, kjøpeguide «Elektriker»	Analysen og bransjen

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.
