


ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Uke 12: bare fire av ti styrebesøk er gjort. Kontrakten skal være signert innen 30. juni.

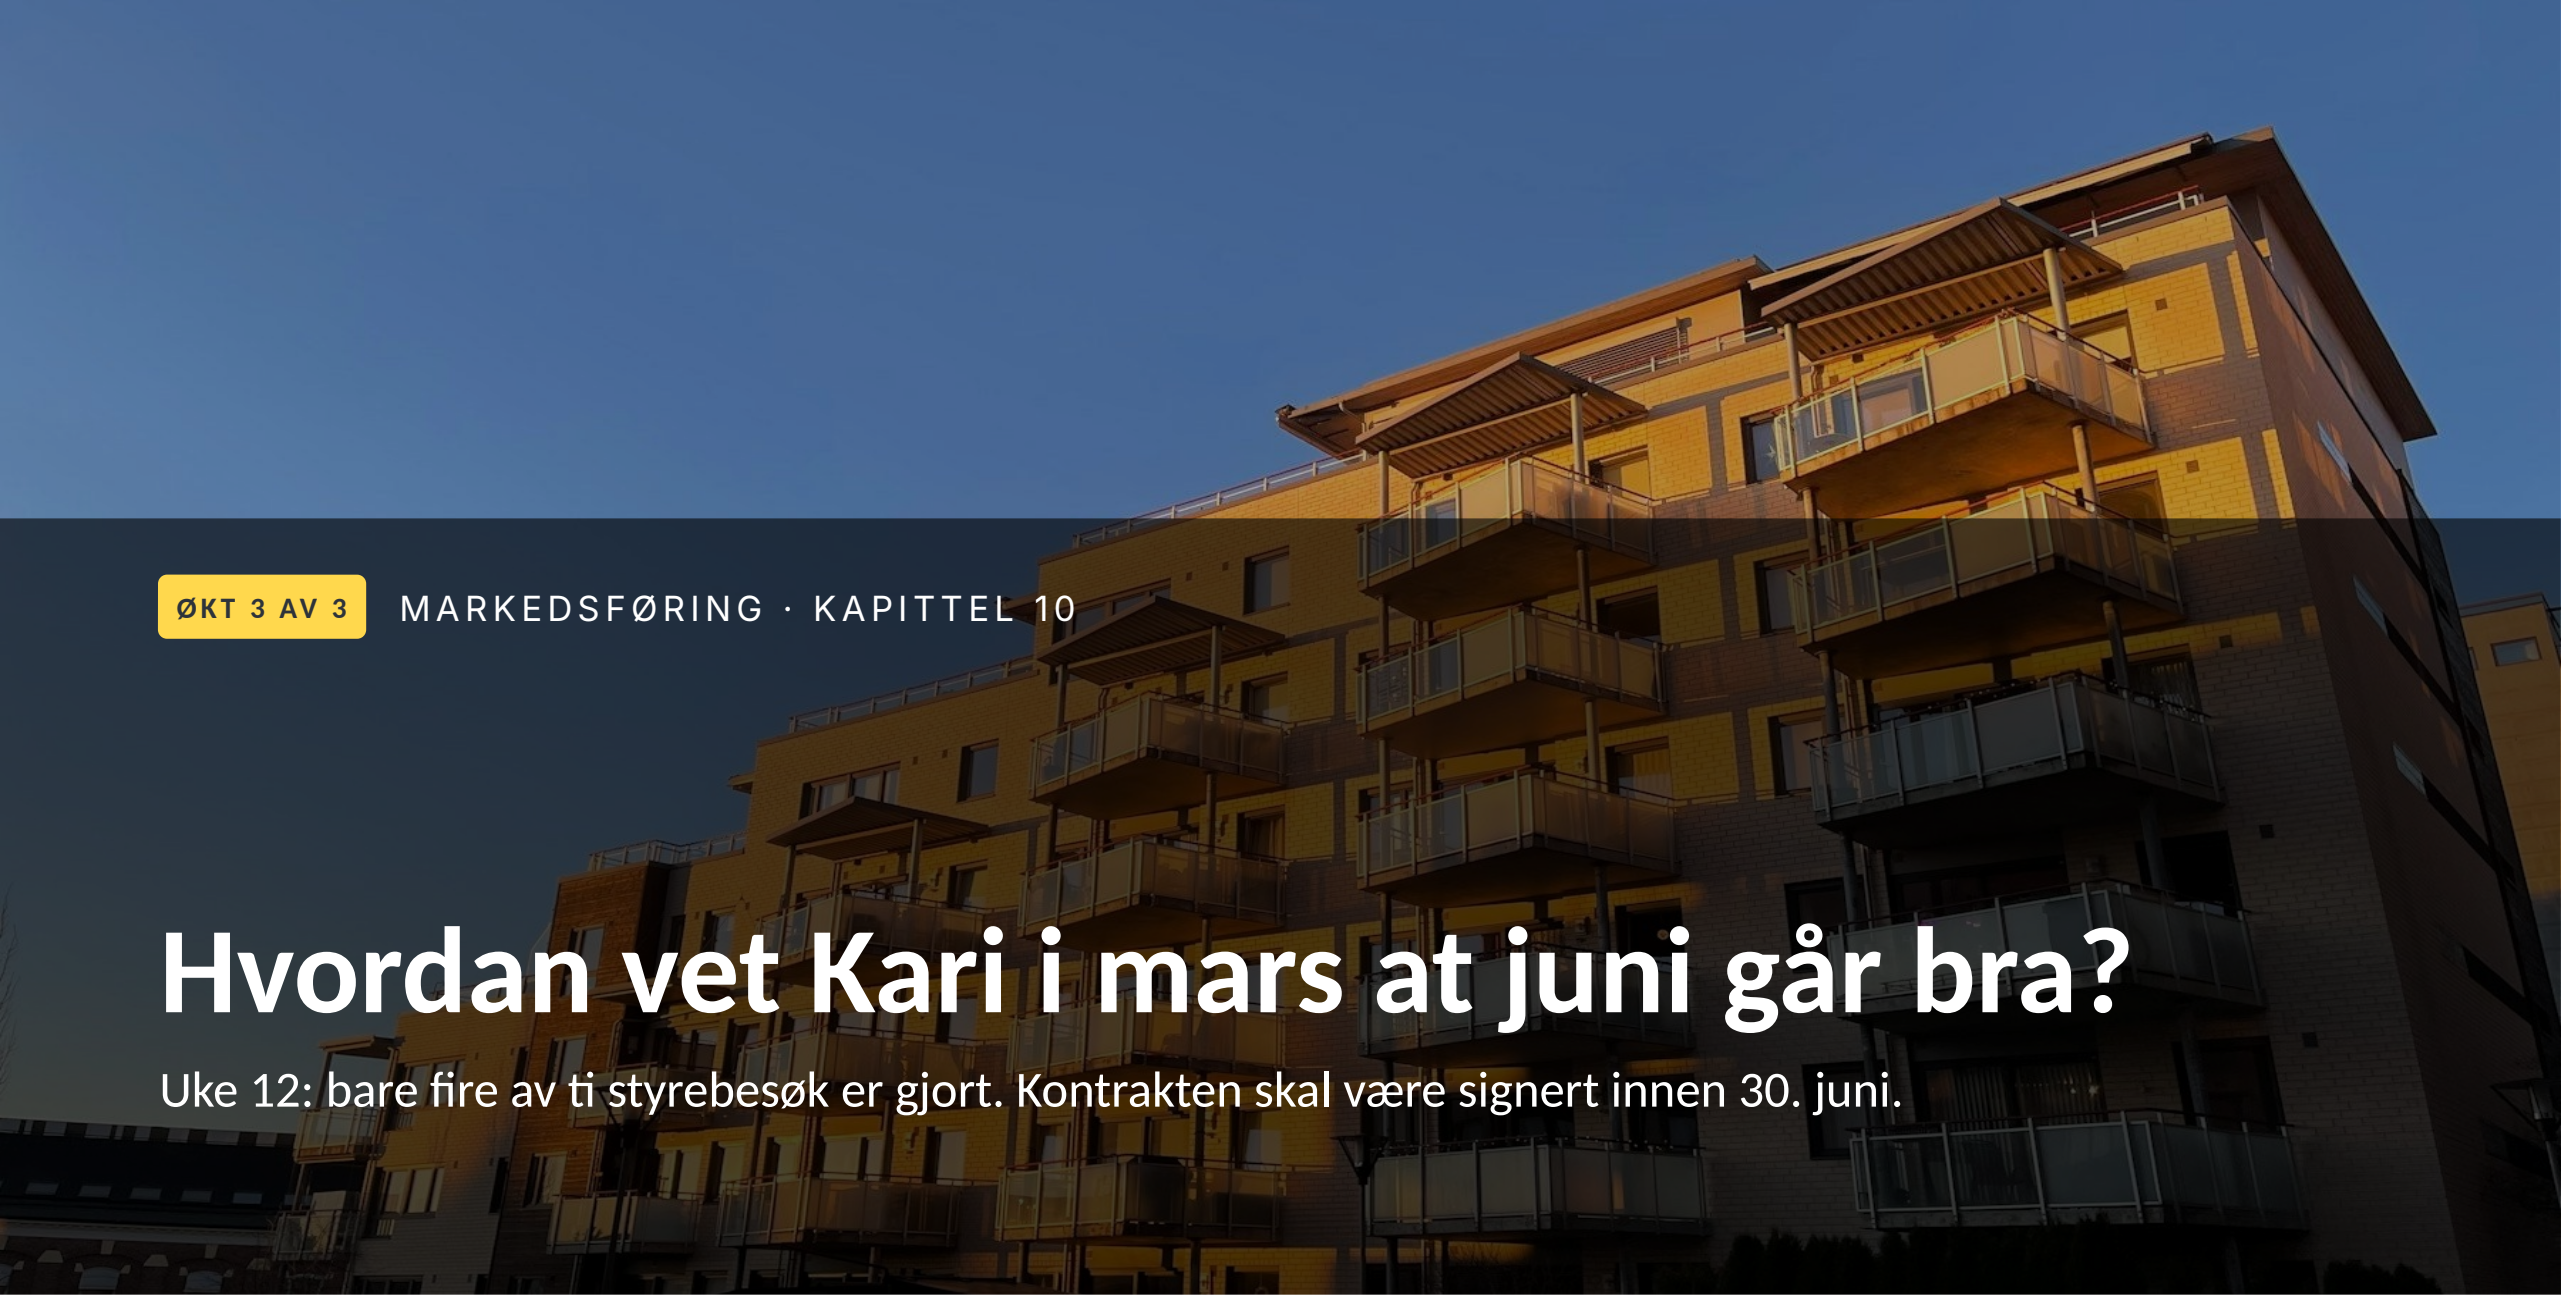

UKE 12 · FREDAG 26. MARS 2027

Fire av ti styrebesøk er gjort. Om 14 uker skal kontrakten være signert.



Bare fire av ti styrebesøk er gjort

KARI, DAGLIG LEDER

«Anbudet har tatt all tiden min. Tilbudsfristen kan vi ikke flytte.»

TOM, DRIFTSLEDER

«Kontrakten skal være signert 30. juni. Skal vi bare vente og se?»

SPØRSMÅLET **Hva gjør Kari nå?**

Hva bør Kari gjøre i uke 12?

A

Vente

til sluttevalueringen i uke 26

B

Justere

dele besøkene med Tom

C

Ny plan

skrive om hele strategien

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fire spørsmål før juni

1

Ansvaret

Hvem sørger for at planen blir gjort?

2

Taktikken

Hva kan Kari endre underveis?

3

Milepælene

Hvordan ser hun avvik mens det er tid?

4

Evalueringen

Når er planen vellykket?

Til slutt setter dere sammen hele markedsplanen i oppgave 1C. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Prosjektledere og styret bruker andre ord enn boka

Milepæl	=	Statusmøte, kontrollpunkt
Handlingsplan	=	Tiltaksliste med eier og frist
Markedsmål	=	KPI, salgsmål
Markedsplan	=	Markedsdelen av forretningsplanen

Ordene til høyre møter du i banken, i styret og på prosjektene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Dette er planen og statusen Kari har foran seg

HANDLINGSPLANEN (UTDRAG), KR	
Uke 6: brev til 24 styreledere	3 537
Uke 8–11: ti styrebesøk	**16 606**
Uke 12: underveisevaluering	**1 310**
Uke 20: forhandling og signering	1 310
Uke 26: sluttevaluering	1 473
= Rammen for hele planen	**40 400**

STATUS FREDAG I UKE 12	
Styrebesøk i planen	10
Styrebesøk gjort	**4**
Styrer som ikke svarte i uke 7	2
Uker til 30. juni	**14**



Til venstre planen styret vedtok i januar. Til høyre status i dag. Avstanden mellom dem er det økta handler om.

Handlingsplanen og statusen er casetall; timesatsen 327,43 kr står i faktaarket.

Kari har ansvaret, og det er tiden hennes som er knapp



Gjennomføringen trenger penger og folk. Kari er også daglig leder og installatør.

REGELEN **Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person (10.6).**

Første linje: ansvaret er Karis, og tiden er knapp

Ansvaret	**Kari**	Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet.	RISIKO
Taktikken	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Milepælen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Evalueringen	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Kan Kari endre noe uten å skrive en ny plan?**



Målet står. Veien dit kan endres

LIGGER FAST

Strategien

Mål og målgruppe: borettslag, kontrakt innen 30. juni.

KAN ENDRES

Taktikken

Ti besøk, hvem som tar dem, hvilke styrer. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen.


REGELEN **Strategien endres bare når rammene endres radikalt. Taktikken endres når noe uforutsett skjer (10.6).**

Uke 12 avslører avviket 14 uker før fristen



Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr. Uten den hadde Kari oppdaget avviket i juni.

REGELEN **Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen (10.7).**

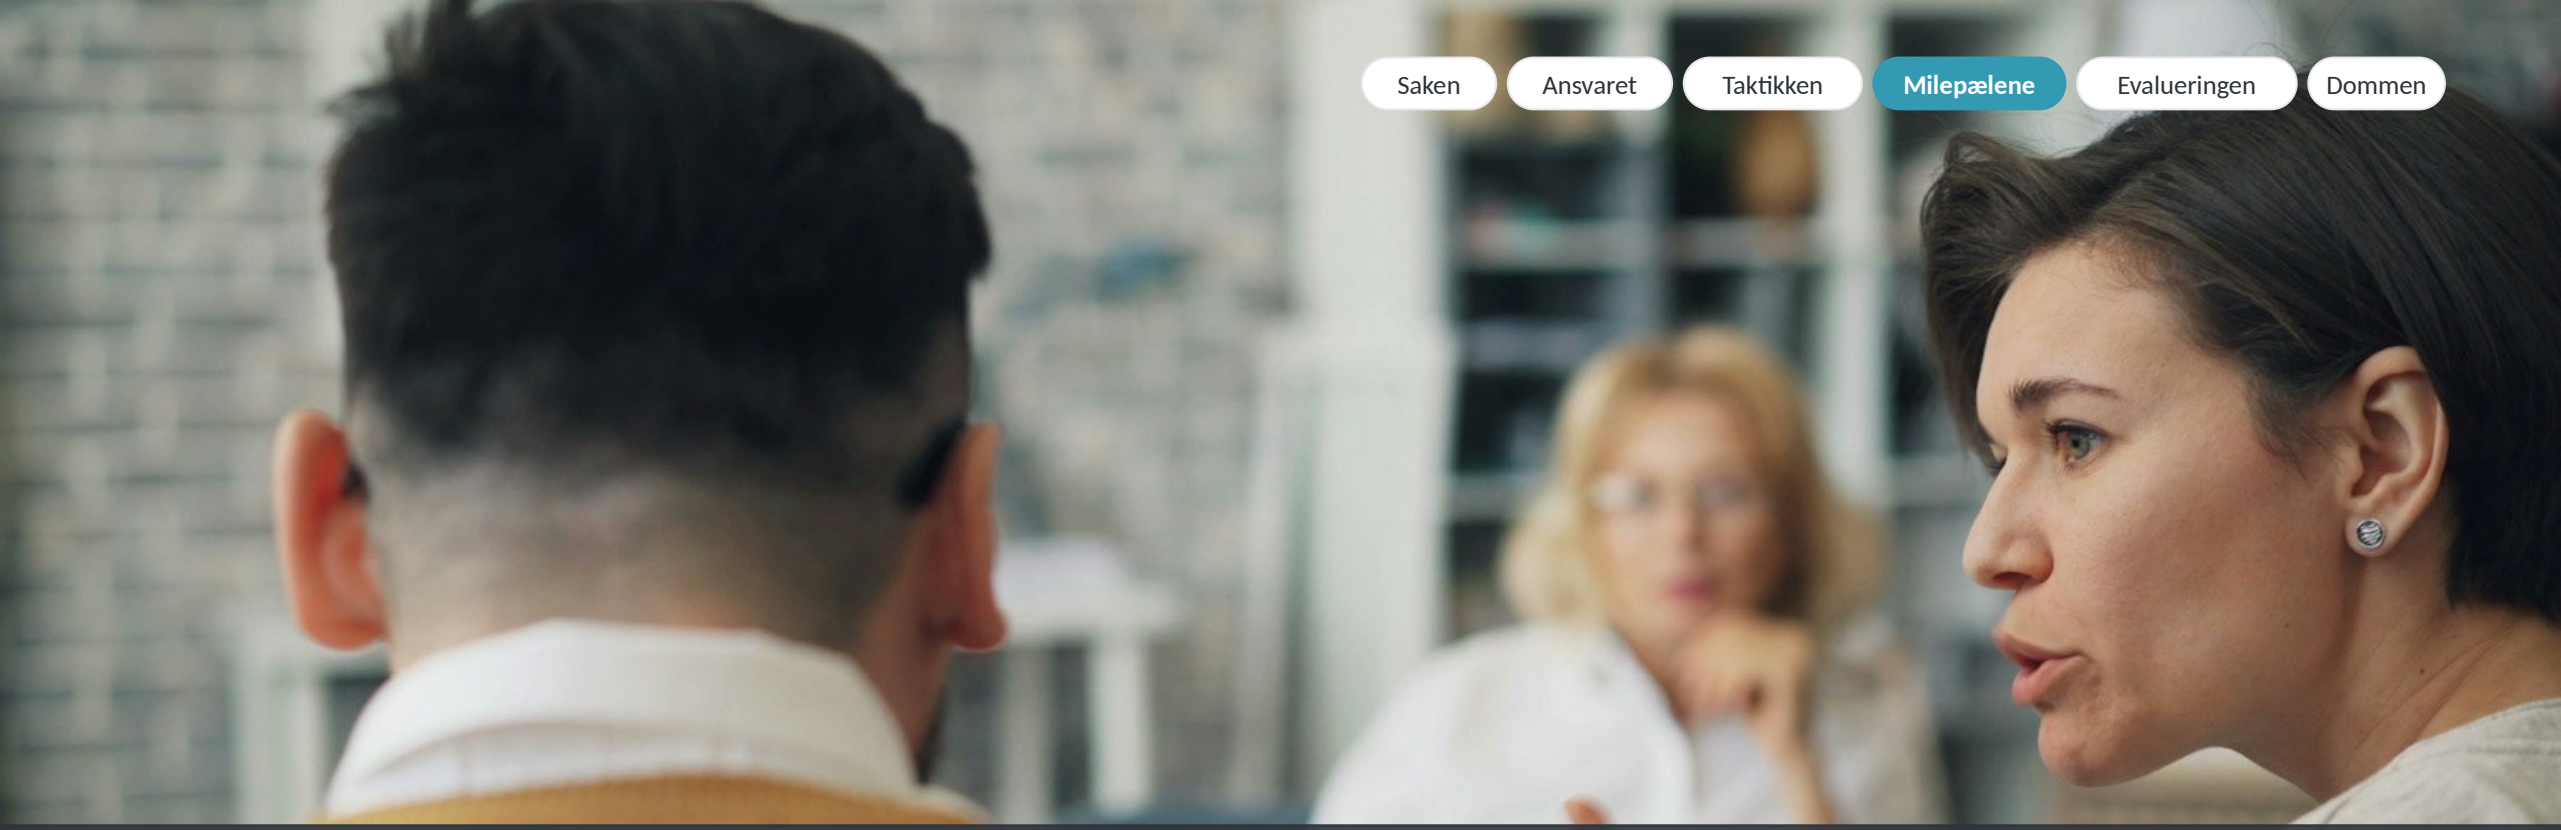

3 · MILEPÆLENE

I januar ville styret kutte underveisevalueringen for å spare 1 310 kr. Kari sa nei.

Slik finner du hva styret ville spare

HVA ER DET?


Hva oppstartsmøtet og underveisevalueringen koster, og hvor stor del det er av det som står på spill.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Styret ville spare penger. Men en kontroll underveis koster lite mot målet den beskytter, og den viser avvik mens det er tid.

SLIK REGNER DU

1 **Milepælen:** 4 × 327,43 = 1 310
2 **Begge linjene:** 8 960 + 1 310 = 10 270
3 **Av gevinsten:** 10 270 / 139 200 = 7,4 %



HANDLINGSPLANEN: LINJENE STYRET VILLE KUTTE

Oppstartsmøte, 14 × 640	8 960
Underveisevaluering, 4 × 327,43	1 310
= Sparte styret	10 270
Ekstra DB på spill	139 200

Kilde: handlingsplanen og arbeidsboka. 640 kr er Idas kalkylesats.

7,4 %

Målet står, taktikken justeres

Ansvaret	**Kari**	Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet.	RISIKO
Taktikken	**Tom**	Tom tar fire besøk. Ida tar mer av anbudskalkylen.	BRA
Milepælen	**4 av 10**	Avviket er synlig i uke 12, 14 uker før fristen.	BRA
Evalueringen	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Ingen kontrakt, men 9 400 kr under rammen. Er det vellykket?**



Ingen kontrakt, men 9 400 kr under budsjett. Vellykket?

A

Ja

under budsjett

B

Nei

målet ble ikke nådd

C

Delvis

billig er bra

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Billig er ikke det samme som vellykket

A

Én kontrakt i uke 20

38 000 kr

Målet nådd innenfor rammen

B

Én kontrakt

46 000 kr

Målet nådd, rammen sprakk med 5 600 kr

C

Ingen kontrakt

31 000 kr

9 400 kr under rammen, men målet ikke nådd

D

Tre kontrakter

40 000 kr

Overoppfylt: var målet for lavt?

Svaret er B. Rammen er 40 400 kr. Utfallene er casetall.

REGELEN **Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.**

Fire spørsmål før Kari konkluderer

4

SPØRSMÅL, ETT FOR HVERT VIRKEMIDDEL

«Kundene ville ikke» er sjelden hele svaret. Spørsmålene leder tilbake til punkt 4.

Utfall C hos Nordlys: ingen kontrakt

Feil målgruppe? kap. 5
For små borettslag, uten elbiler ennå?

For svakt produkt? kap. 6
Manglet trinnvis utbygging eller drift?

Prisen dårlig brukt? kap. 7
Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet?

Kommunikasjonen? kap. 9
Fikk styret svar på befaringen?

REGELEN **Feil målgruppe? Svakt produkt? Prisen dårlig brukt? Kommunikasjonen sviktet? (10.7)**

Notatet er ferdig: målet og rammen

Ansvaret	**Kari**	Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet.	RISIKO
Taktikken	**Tom**	Tom tar fire besøk. Ida tar mer av anbudskalkylen.	BRA
Milepælen	**4 av 10**	Avviket er synlig i uke 12, 14 uker før fristen.	BRA
Evalueringen	**40 400**	Vellykket er kontrakt innen 30. juni, innenfor rammen på 40 400 kr.	BRA

NESTE **Sett sammen hele markedsplanen selv i oppgave 1C.**



JOBB NÅ

1C

20 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.

Hele markedsplanen for solcelle og lading på én side

Punkt 1–2: forretningsidé, vekststrategi og situasjonsanalyse med tall

Punkt 3–4: hovedmål og delmål 1.3, og fem tiltak på de fem leddene

Punkt 5: handlingsplanens sum

Punkt 6–7: hva Kari gjør i uke 7 og uke 12, og fire utfall

Til slutt: hva lappen manglet

Ferdig når

Alle feltene fylt.
40 400 kr, fem grønne på leddene og fire på utfallene.
Alene, i par eller i gruppe.

Planen Kari tar med til styret, og hva lappen manglet

Punkt 1–3

+ 20 %

Markedsutvikling. Fire ruter med tall. 20 plasser innen 30.6., Kari

Punkt 4–5

40 400 kr

Borettslag, felles anlegg, kvantumsrabatt, Polarlys, brev og besøk

Punkt 6

Juster

Uke 7: ring to andre. Uke 12 med 4 av 10: del besøkene

Punkt 7

A B C D

Nådd innenfor rammen, sprakk, ikke nådd, overoppfylt

Lappen manglet analysen, frist og ansvarlig på målet, uke, navn og budsjett på hvert tiltak, en sum styret kan si ja til, og milepæler.

Markedsplanen i prosjektet ditt

1

Hvilke av de sju punktene har dere?

Se på markedsdelen i prosjektoppgaven eller planen i bedriften. Hvilke punkter mangler helt?

2

Har målene tall, frist og navn?

Skriv ett mål om slik at det har alle tre. Hva blir det i dekningsbidrag?

3


Hvor ville dere satt en milepæl?

Hvilken uke, hvilket tall, og hvem sjekker? Hva gjør dere hvis tallet ikke er nådd?

REGELEN

Uten uke, navn og sum er en markedsplan en lapp.

Sju punkter i fast rekkefølge

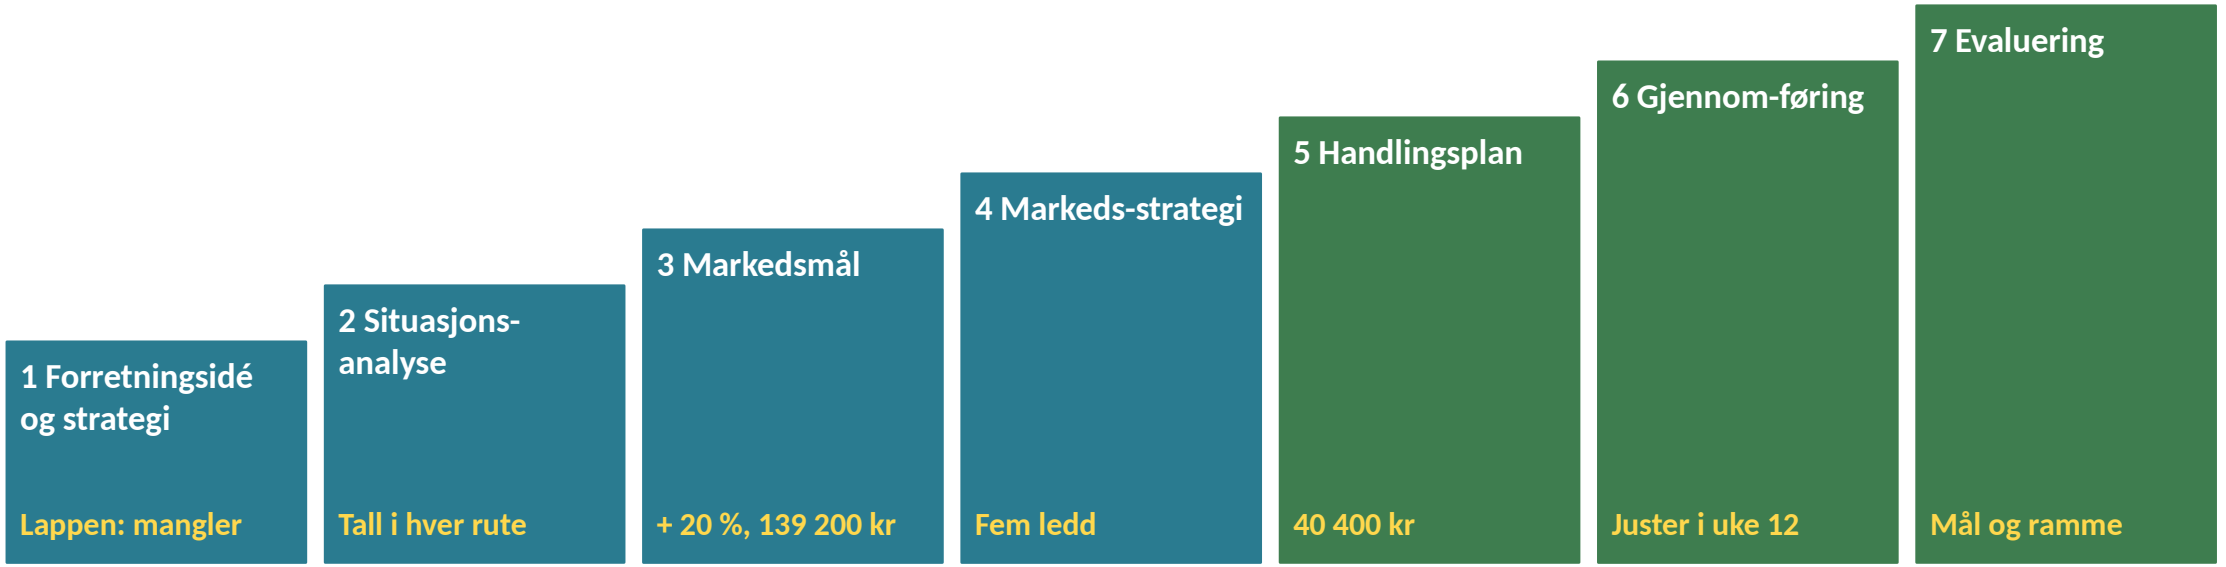

Analyse før mål, mål før tiltak, milepæler før evaluering. Det er markedsdelen av forretningsplanen i prosjektet ditt.

Kari justerer i mars, så juni ikke blir en overraskelse

4 av 10

besøk i uke 12. Milepælen viste avviket mens det var 14 uker igjen.

1 310 kr

kostet milepælen. Det var den styret ville kutte.

40 400 kr

er rammen. Vellykket er kontrakten innenfor den.

SVARET

Strategien ligger fast, taktikken justeres. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 og 10.7. Repeter evalueringen av kampanjer i 9.11.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Kan du forklare …

Hvem som har ansvaret for gjennomføringen.

Strategi fast, taktikk fleksibel.

Milepæler.

Fire utfall og fire spørsmål.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash (Marlene Céline Nordvik, Vitaly Gariev, Towfiqu barbhuiya, Andreea Avramescu).
