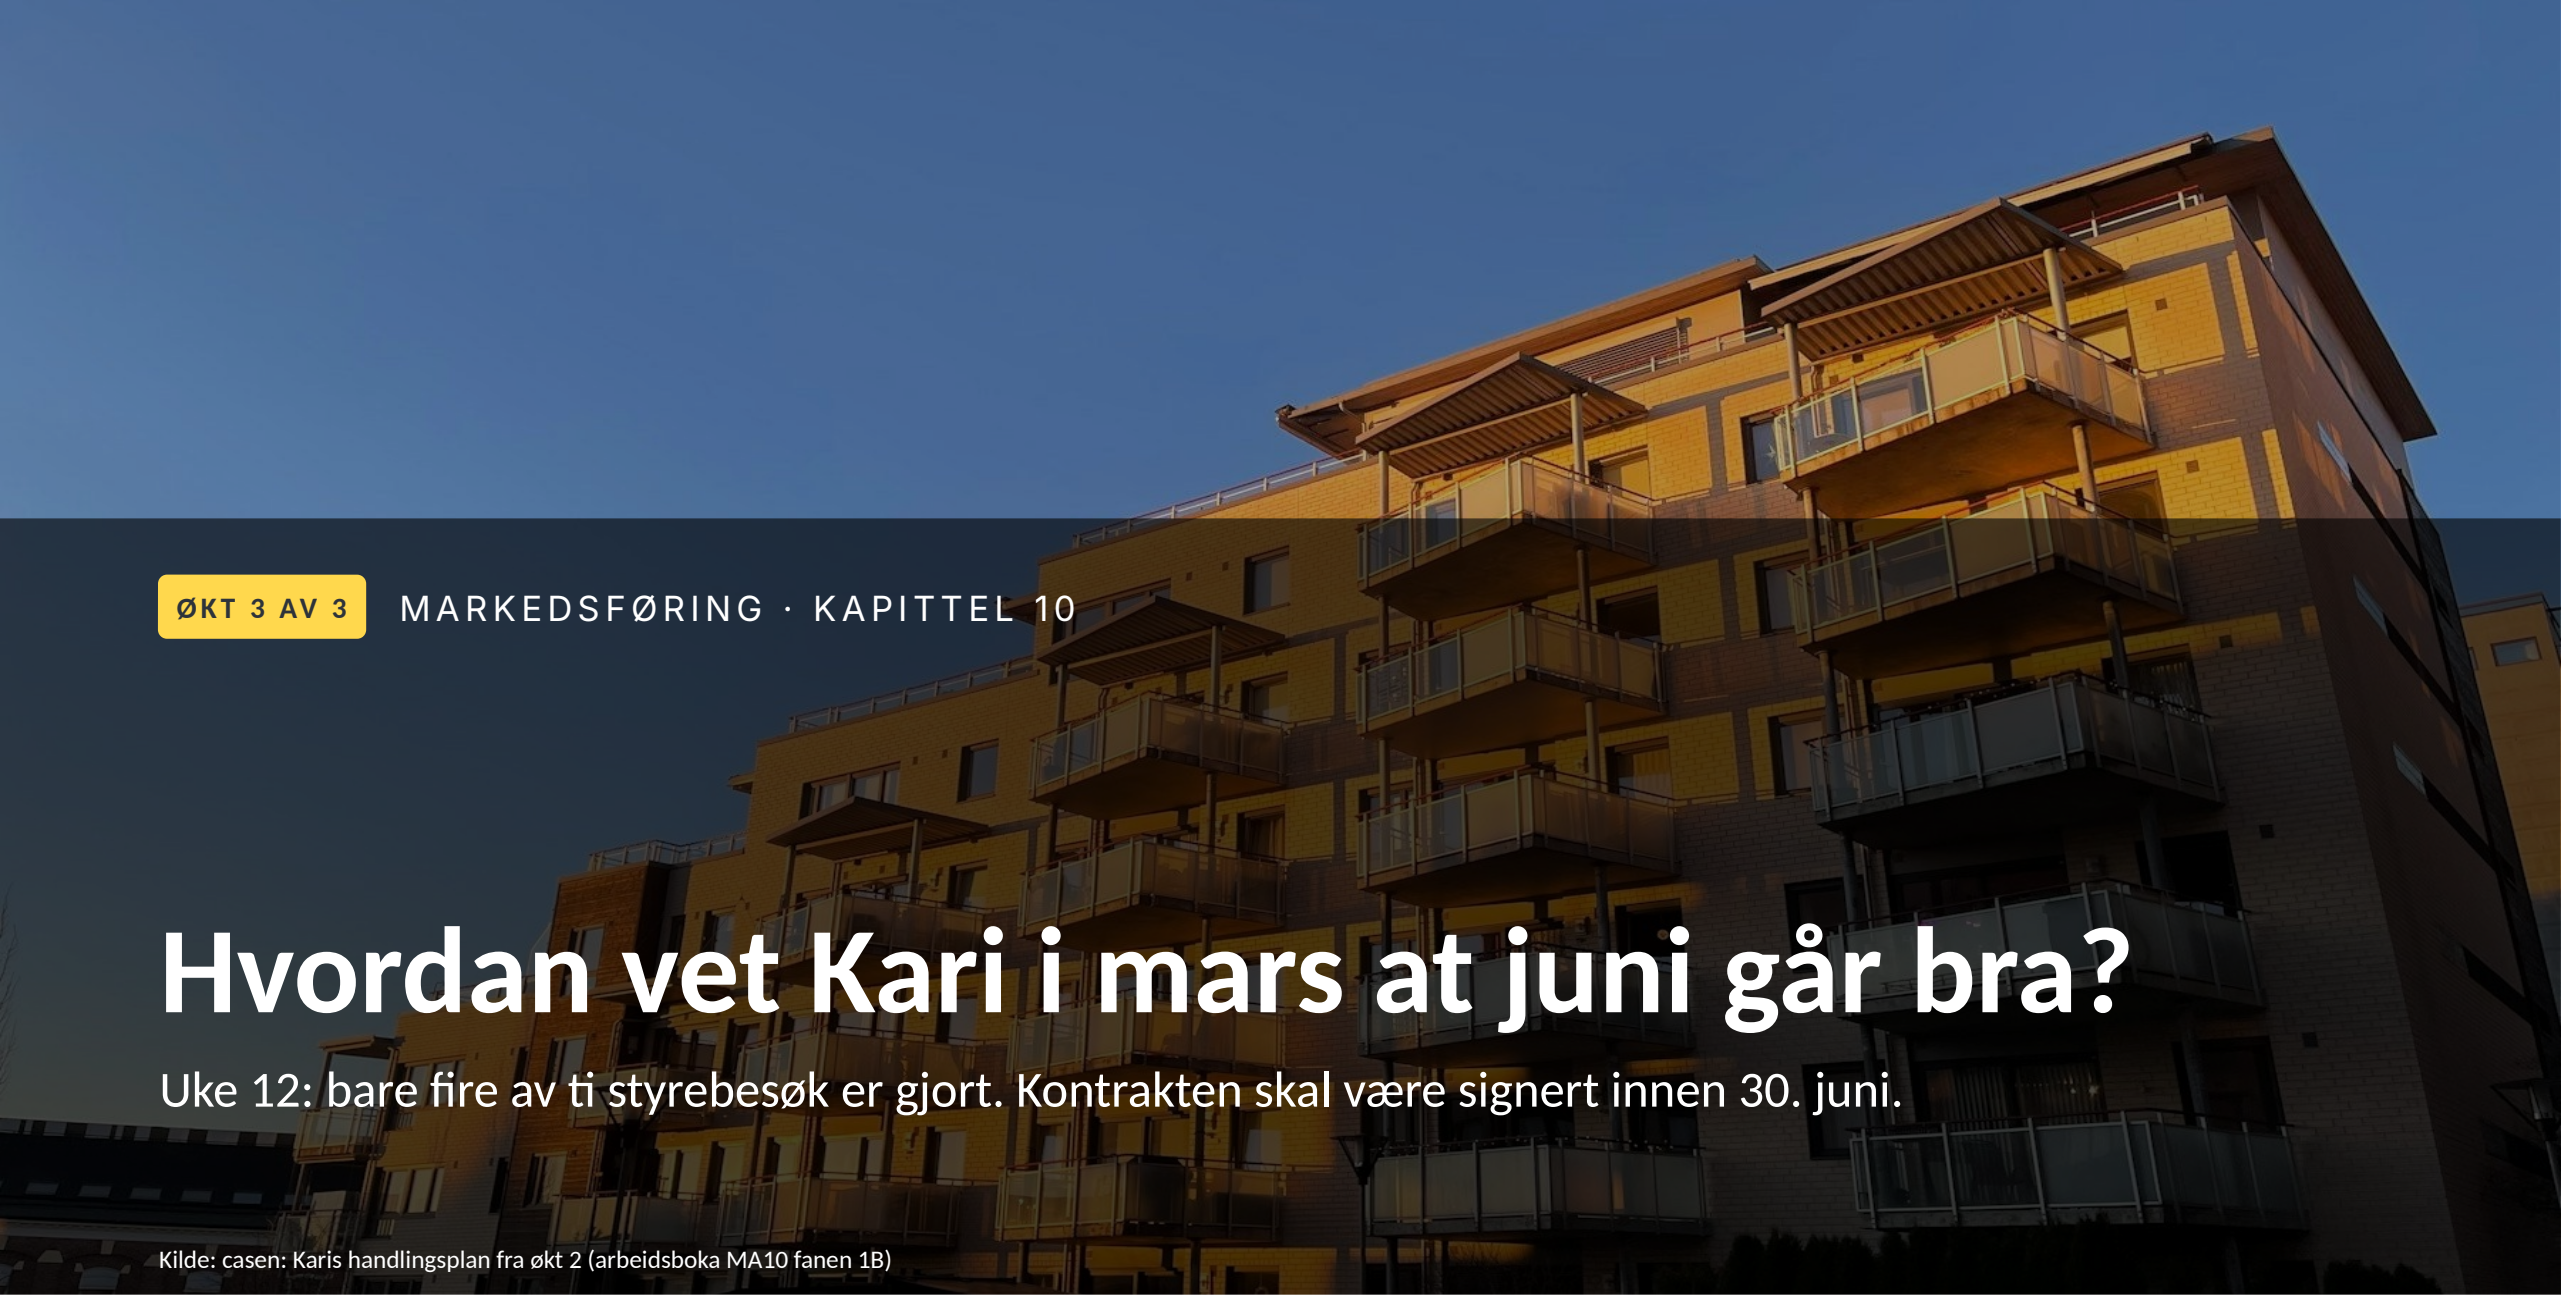


ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Uke 12: bare fire av ti styrebesøk er gjort. Kontrakten skal være signert innen 30. juni.

Kilde: casen: Karis handlingsplan fra økt 2 (arbeidsboka MA10 fanen 1B)

Markedsplanen – et sammendrag

HVA KAPITLET HANDLER OM

Kapittel 10 setter sammen alt fra markedsføringen til ett dokument: markedsplanen. Den har sju punkter i fast rekkefølge. De fire første kjenner dere fra kapittel 3 og 5–9. De tre siste er nye: handlingsplan, gjennomføring og evaluering. Boka bruker byggevarekjeden Bygghandel AS som eksempel. Vi bruker avdelingen for solceller og ladepunkt hos Nordlys Elektro.

ETTER KAPITLET SKAL DU

1. Vite hva en markedsplan er og kunne gjøre rede for de ulike delene av den
2. Gjøre rede for forretningsidé, overordnet mål og strategi (med vekst- og konkurransestrategier) og situasjonsanalysen (SOFT-analyse) (10.1–10.2)
3. Gjøre rede for valg av markedsmål og valg av markedsstrategi (10.3–10.4)
4. Gjøre rede for handlingsplanen (10.5, tabell 10.1)
5. **Gjøre rede for gjennomføring og evaluering av gjennomføring og måloppnåelse (10.6–10.7)**

I DAG

Mål 5: gjennomføring og evaluering av gjennomføring og måloppnåelse (10.6–10.7)

Kapittel 10 har ingen egne mål. Målene er bokas mål for markedsplanen (kapittel 3), delt etter de sju punktene i kapittel 10. Gule mål tar vi i dag.

Gjennomføring og evaluering: holde kursen, og vite om målet ble nådd

HVA ER DETTE?

Hvem som passer på at planen blir gjort, sjekkpunktene underveis, og vurderingen når perioden er over.

Boka: gjennomføring (10.6) og evaluering (10.7).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

Resultatet ved slutten skal ikke komme som en overraskelse. Et avvik i mars kan rettes; i juni er det for sent.

Boka: resultatene må overvåkes løpende, med milepæler i planen (10.7).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Daglig leder sjekker milepælene, justerer taktikken og holder fast på målet.

Boka: det viktigste er ikke å følge planene til punkt og prikke, men at målene nås (10.6).

Markedsføring, organisasjon og ledelse · kapittel 10, 10.6 og 10.7 · eksemplene fra elektrobransjen er våre

REGELEN **Strategien ligger fast, taktikken justeres.**

Bokas punkt 6 og 7, uke 12 hos Nordlys, og hele planen på én side

18 min

Boka: ansvaret og taktikken

Hvem sørger for at planen blir gjort. Strategien ligger fast, taktikken kan endres. En bransjefakta.

12 min

Milepælene og evalueringen

Uke 12 avslører avviket. Fire utfall, og fire spørsmål når målet glipper.

15 min

Oppgave 1C

Alene eller sammen: hele markedsplanen for solcelle og lading på én side.

10 min

Svar og dom

Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva lappen manglet.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Bare fire av ti styrebesøk er gjort

KARI, DAGLIG LEDER

«Anbudet har tatt all tiden min. Tilbudsfristen kan vi ikke flytte.»

TOM, DRIFTSLEDER

«Kontrakten skal være signert 30. juni. Skal vi bare vente og se?»

SPØRSMÅLET **Hva gjør Kari nå?**

Kilde: casen: handlingsplanen fra økt 2 (arbeidsboka MA10 fanen 1B).

Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

DET VET VI

Kontrakten skal være signert innen 30. juni, om 14 uker. Anbudet har tatt Karis tid, og tilbudsfristen kan ikke flyttes. To styrer svarte aldri i uke 7.

A Vente

Planen har en sluttevaluering i uke 26. Der ser Kari om målet ble nådd, og hun kan rette opp neste år.

B Justere

Behold målet og målgruppen, men endre veien dit: Tom tar flere besøk, og Ida tar mer av anbudskalkylen.

C Ny plan

Når planen ikke holder etter tolv uker, er den feil. Kari bør skrive om strategien før hun bruker mer tid.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Kilde: casen: fristen 30. juni og de ti besøkene i handlingsplanen fra økt 2 (arbeidsboka fanen 1B).

Punkt 6: styret og daglig leder har det øverste ansvaret. Noen må ha det daglige

KORT SAGT


Med vanlige ord: hvem passer på at planen blir gjort? Boka kaller det gjennomføring, eller iverksettelse (10.6).

Styret og daglig leder har det øverste ansvaret. Markedssjefen har det daglige ansvaret.

Arbeidet må få nok ressurser: både økonomiske og personellmessige, altså penger og folk.

En liten bedrift har sjelden markedssjef. Da må rollen stå på et navn, og den personen må få tid.

ANSVARET HOS NORDLYS

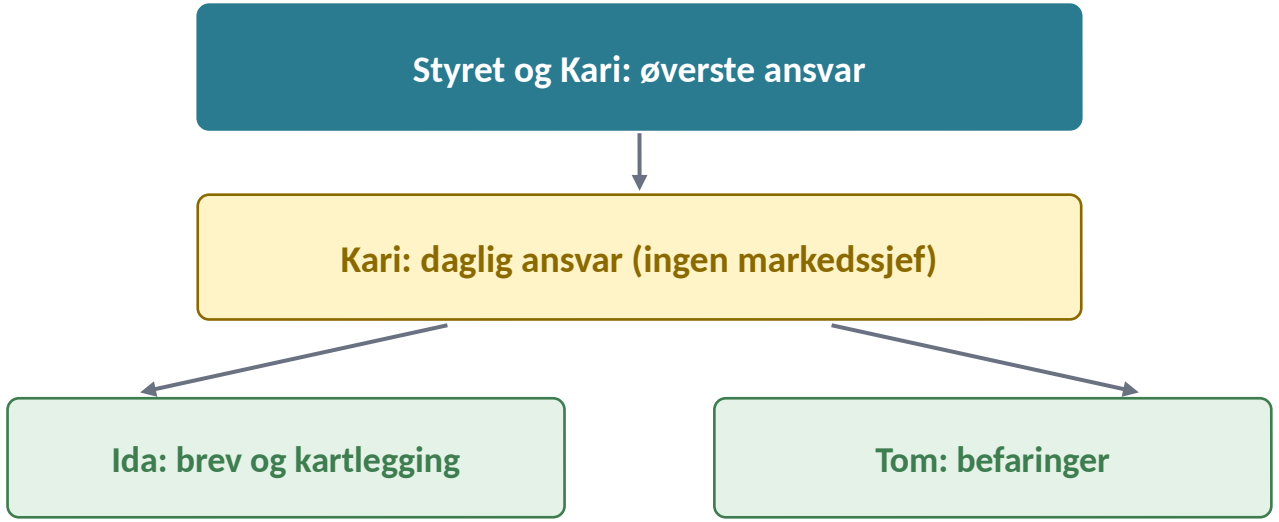

HOS NORDLYS Kari har både det øverste og det daglige ansvaret, og hun er installatør i tillegg. Det er tiden hennes som er knapp: anbudet tok den.

REGELEN **Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person (10.6).**

Kilde: casen: Nordlys har ingen markedssjef; ansvaret står på navn i handlingsplanen (arbeidsboka fanen 1B).

Strategien ligger fast. Taktikken kan endres når noe uforutsett skjer

KORT SAGT

- Strategien må få tid til å virke. Hovedtrekkene i markedsplanen ligger fast.
- Bare når rammebetingelsene endrer seg radikalt, kan planen forkastes og en ny lages.
- Taktikken, altså hvordan vi gjør det denne uka, kan endres når noe uforutsett skjer. Boka kaller det beredskap for improvisasjon.
- Boka: det viktigste er ikke å følge planene til punkt og prikke, men at målene nås.

MÅLET STÅR. VEIEN DIT KAN ENDRES

LIGGER FAST

Strategien

Mål og målgruppe: borettslag, kontrakt innen 30. juni.

KAN ENDRES

Taktikken

Ti besøk, hvem som tar dem, hvilke styrer. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen.

HOS NORDLYS Uke 7: to styrer svarte aldri, Kari ringte to andre på lista. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudet.

REGELEN **«Strategien ligger fast, men taktikken må kunne endres underveis» (10.6).**

Kilde: uke 12 og fristen 30. juni: handlingsplanen fra økt 2; 12 montører: faktaarket.

Markedet for solkraft har falt tre år på rad

–70 %

Så langt i 2026, mot samme periode året før. Det skrev NHO Elektro til Stortinget i april.

Først falt markedet 47 % i 2024. I 2025 falt det 24 % til. Og i starten av 2026 var det om lag 70 % lavere enn i samme periode året før.

NHO Elektro skriver at en rekke aktører har gått konkurs eller gjennomført betydelige nedbemanninger.

FOR OSS: Når rammebetingelsene endrer seg så radikalt, sier boka at planen kan forkastes og en ny lages (10.6). Ellers ligger strategien fast.

Sola skinner like mye som før. Det er kundene som har gått i skyggen.

Kilde: NHO Elektro, innspill til Stortinget om solkraft på tak (representantforslag 260 S), 15.04.2026, s. 1

Punkt 7: milepælen i uke 12 avslører avviket 14 uker før fristen

KORT SAGT


Boka: resultatene ved slutten bør ikke komme som en stor overraskelse. Resultatene må følges løpende (10.7).

Med vanlige ord: avtalte sjekkpunkter underveis. Boka kaller dem milepæler eller delmål.

En milepæl har en uke, et tall og noen som sjekker, og den settes inn i planen på forhånd.

Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr (4 × 327,43). Det var den styret ville kutte i januar.

MILEPÆLENE I HANDLINGSPLANEN



HOS NORDLYS Uten milepælen hadde Kari sett avviket i juni, når det er for sent. Med den har hun 14 uker til å rette det.

REGELEN **Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen.**

Kilde: 4 timer × 327,43 kr (timesatsen fra økt 2, regnet fra faktaarket) = 1 310 kr.

Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

DET VET VI

Rammen for planen er 40 400 kr. Målet er en kontrakt om et felles ladeanlegg innen 30. juni. Tenk dere at planen kostet 31 000 kr, og ingen styrer signerte.

A Ja

Planen kostet 31 000 kr, 9 400 under rammen. Styret ville spare penger, og det ble gjort.

B Nei

Målet var en kontrakt innen 30. juni. Uten kontrakt er de 31 000 kronene brukt uten at målet ble nådd.

C Delvis

Målet glapp, men kostnaden holdt. Det ene veier opp for halvparten av det andre.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Kilde: 40 400 kr: rammen fra økt 2. 31 000 kr er et tenkt utfall.

Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

A Ja

HOLDER IKKE

Under budsjett sier bare at det ble brukt lite. Vellykket er målet nådd innenfor rammen, og målet var kontrakten.

B Nei

RIKTIG

Vellykket er to ting samtidig: målet nådd og innenfor rammen. Uten kontrakt er 31 000 kr brukt uten det planen skulle gi.

C Delvis

HOLDER IKKE

Rammen er en grense, ikke et mål. Å bruke lite veier ikke opp for at kontrakten uteble.

REGELEN **Vellykket = målet nådd + innenfor rammen (9.11). Under budsjett uten mål er ikke vellykket.**

Kilde: tallene fra lysbilde 11.

Vellykket er målet nådd, og innenfor rammen. Billig er ikke det samme

KORT SAGT

- Når perioden er over, vurderer ledelsen resultatene mot målene (10.7).
- Vellykket er begge deler: målene innfridd, og innenfor budsjettrammen (9.11).
- Overoppfylles målene, skal bedriften spørre om ambisjonsnivået var for lavt.
- Evaluer både sluttproduktet og prosessen. Lær av feilene, og av det som virket.

FIRE UTFALL AV SAMME PLAN, RAMME 40 400 KR (CASETALL)

A	B	C	D
Én kontrakt i uke 20	**Én kontrakt**	**Ingen kontrakt**	**Tre kontrakter**
38 000 kr	**46 000 kr**	**31 000 kr**	**40 000 kr**
Målet nådd innenfor rammen: vellykket	Målet nådd, rammen sprakk med 5 600 kr	9 400 kr under rammen, men målet ikke nådd	Overoppfylt: var målet for lavt?

HOS NORDLYS

Rammen sprekker ofte på timene. Utfall C ser bra ut fordi det er billig, men uten kontrakt er de 31 000 kronene brukt til ingenting.

REGELEN

Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Overoppfylt? Spør om målet var for lavt (10.7).

Kilde: fire tenkte utfall av samme plan (casetall); rammen 40 400 kr fra økt 2.

Når målet ikke nås: bokas fire spørsmål, ett for hvert virkemiddel

KORT SAGT

Når salgsmålene ikke innfris, må gjennomføringen settes under lupen (10.7).

Ble det satset på feil målgrupper? Var produkttilbudet for lite konkurransedyktig?

Ble mulighetene for prisdifferensiering for dårlig utnyttet? Sviktet kommunikasjonen med markedet?

Spørsmålene leder tilbake til markedsstrategien i punkt 4.

UTFALL C HOS NORDLYS: INGEN KONTRAKT

Feil målgruppe? kap. 5
For små borettslag, uten elbiler ennå?

For svakt produkt? kap. 6
Manglet drift og service etterpå i tilbudet?

Prisdifferensiering dårlig brukt? kap. 7
Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet?

Kommunikasjonen sviktet? kap. 9
Fikk styret svar på spørsmålene på befaringen?

HOS NORDLYS Svarene blir mer realistiske, og kanskje mer ambisiøse, mål for neste periode. Det er bokas siste setning i kapitlet.

REGELEN **Målgruppe? Produkt? Prisdifferensiering? Kommunikasjon? (10.7)**

Hele markedsplanen for solcelle og lading på én side

15

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Markedsføring kap. 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- Punkt 1–2: forretningsidé, vekststrategi og situasjonsanalyse med tall.
- Punkt 3–4: hovedmål og delmål 1.3, og fem tiltak på de fem leddene.
- Punkt 5–7: handlingsplanens sum, hva Kari gjør i uke 7 og uke 12, og fire utfall.
- Til slutt: hva lappen manglet.

LEVER

Én side med alle sju punkter, og setningen om hva lappen manglet.

Ferdige før tiden? Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Kilde: arbeidsboka MA10, fanen 1C.

Planen Kari tar med til styret, og hva lappen manglet

Punkt 1–3

+ 20 %

Markedsutvikling. Fire ruter med tall. 20 plasser innen 30.6.

Punkt 4–5

40 400 kr

Borettslag, felles anlegg, kvantumsrabatt, Polarlys, brev og besøk

Punkt 6

Juster

Uke 7: ring to andre. Uke 12 med 4 av 10: del besøkene

Punkt 7

A B C D

Vellykket, rammen sprakk, ikke nådd, overoppfylt

Lappen manglet analysen, frist og ansvarlig på målet, uke, navn og budsjett på hvert tiltak, en sum styret kan si ja til, og milepæler.

Kilde: arbeidsboka MA10, fanen 1C og Fasit.

Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

A Vente

HOLDER IKKE

I uke 26 er fristen 30. juni nesten passert. Milepælen i uke 12 finnes nettopp for å rette avvik mens det er 14 uker igjen.

B Justere

RIKTIG

Målet, kontrakt innen 30. juni, og målgruppen ligger fast. Besøkene er taktikk: Tom tar fire, Ida tar mer av kalkylen, så Kari får tid.

C Ny plan

HOLDER IKKE

Strategien endres bare når rammene endres radikalt. To styrer som ikke svarte og et anbud er uforutsett, ikke et nytt marked.

REGELEN **Strategien ligger fast, men taktikken må kunne endres underveis (10.6).**

Kilde: 14 uker: fra uke 12 til fristen 30. juni (lysbilde 6).

Kari justerer i mars, så juni ikke blir en overraskelse

4 av 10

besøk i uke 12. Milepælen viste avviket mens det var 14 uker igjen.

1 310 kr

kostet milepælen. Det var den styret ville kutte.

40 400 kr

er rammen. Vellykket er kontrakten innenfor den.

Kilde: 4 av 10 fra lysbilde 5, 1 310 kr fra lysbilde 10, 40 400 kr fra økt 2.

SVARET

Strategien ligger fast, taktikken justeres. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 og 10.7. Repeter evalueringen av kampanjer i 9.11.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

Kan du forklare …

Hvem som har ansvaret for gjennomføringen.

Strategien ligger fast, taktikken kan endres.

Milepæler.

Vellykket, og de fire spørsmålene.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 3.7 og 9.11). NHO Elektro (15.04.2026). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash.
