


ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

# Hvordan vet Kari i mars at juni går bra?

Uke 12: bare fire av ti styrebesøk er gjort. Kontrakten skal være signert innen 30. juni.

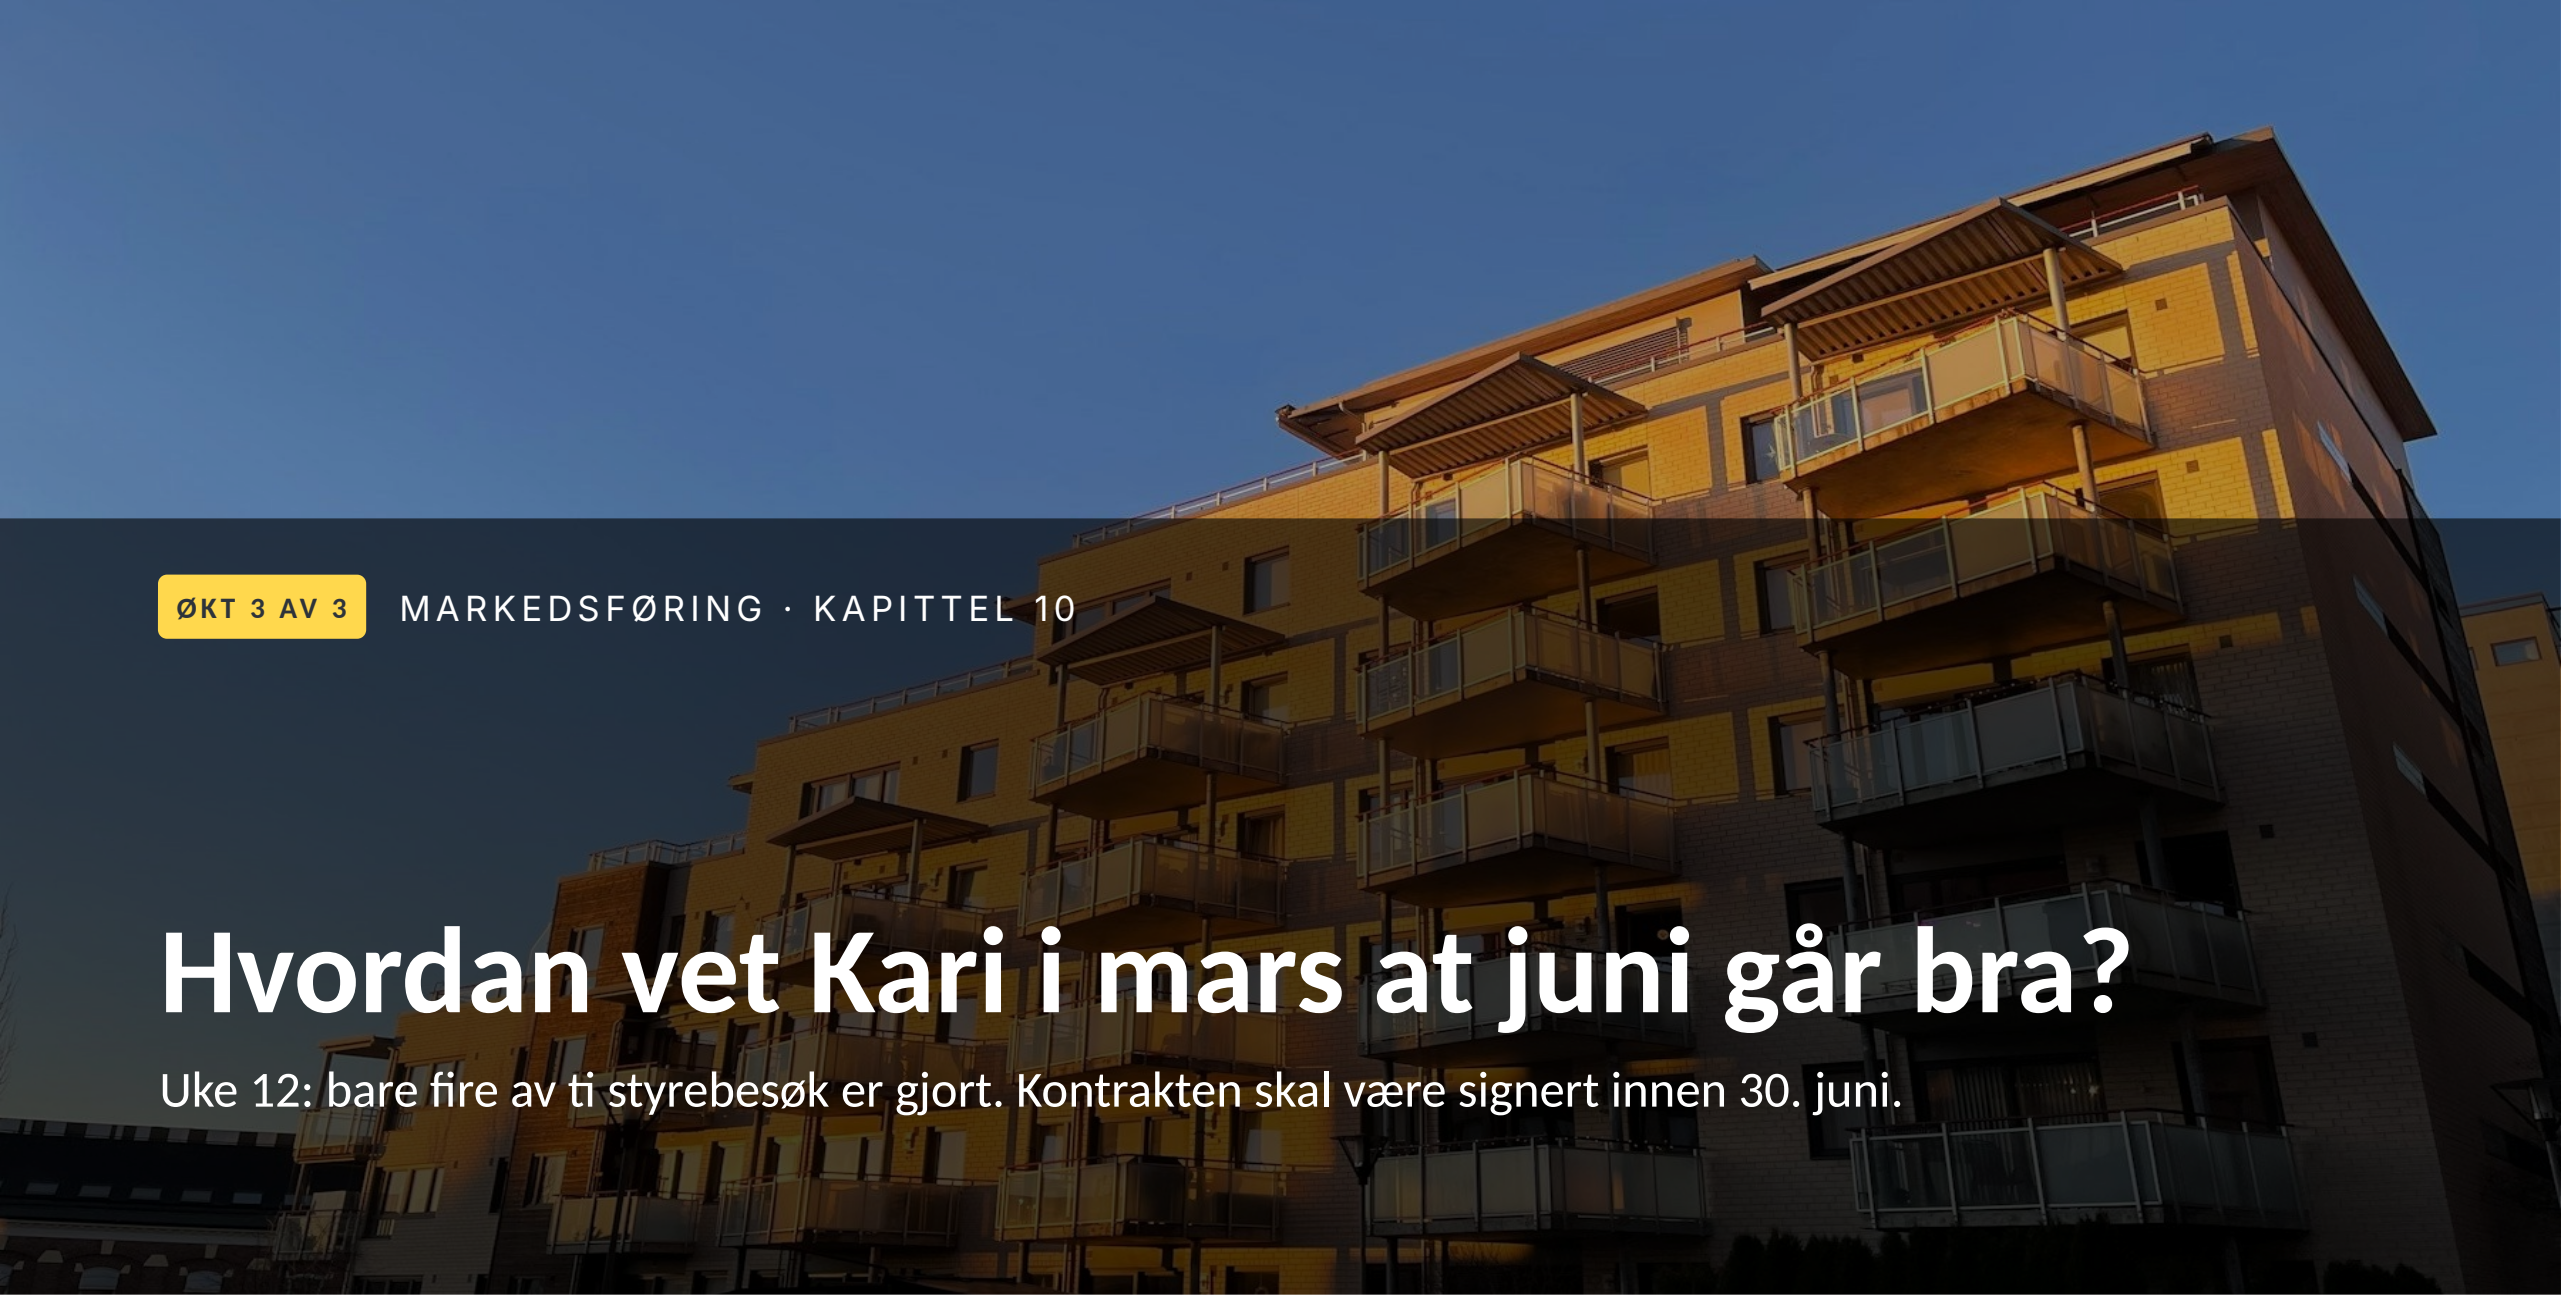

UKE 12 · FREDAG 26. MARS 2027

# Fire av ti styrebesøk er gjort. Om 14 uker skal kontrakten være signert.





# Bare fire av ti styrebesøk er gjort

KARI, DAGLIG LEDER

**«Anbudet har tatt all tiden min. Tilbudsfristen kan vi ikke flytte.»**

TOM, DRIFTSLEDER

**«Kontrakten skal være signert 30. juni. Skal vi bare vente og se?»**

SPØRSMÅLET **Hva gjør Kari nå?**

# Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

DET VET VI

Kontrakten skal være signert innen 30. juni, om 14 uker. Anbudet har tatt Karis tid, og tilbudsfristen kan ikke flyttes. To styrer svarte aldri i uke 7.

## A Vente

Planen har en sluttevaluering i uke 26. Der ser Kari om målet ble nådd, og hun kan rette opp neste år.

## B Justere

Behold målet og målgruppen, men endre veien dit: Tom tar flere besøk, og Ida tar mer av anbudskalkylen.

## C Ny plan

Når planen ikke holder etter tolv uker, er den feil. Kari bør skrive om strategien før hun bruker mer tid.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

# Fire spørsmål før juni

1

## Ansvaret

Hvem sørger for at planen blir gjort?

2

## Taktikken

Hva kan Kari endre underveis?

3

## Milepælene

Hvordan ser hun avvik mens det er tid?

4

## Evalueringen

Når er planen vellykket?

Til slutt setter dere sammen hele markedsplanen i oppgave 1C. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

# Prosjektledere og styret bruker andre ord enn boka

| | | |
|---|---|---|
| Milepæl | = | Statusmøte, kontrollpunkt |
| Handlingsplan | = | Tiltaksliste med eier og frist |
| Markedsmål | = | KPI, salgsmål |
| Markedsplan | = | Markedsdelen av forretningsplanen |

*Ordene til høyre møter du i banken, i styret og på prosjektene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.*

# Dette er planen og statusen Kari har foran seg

| HANDLINGSPLANEN (UTDRAG), KR | |
|---|---|
| Uke 6: brev til 24 styreledere | 3 537 |
| **Uke 8–11: ti styrebesøk** | **16 606** |
| **Uke 12: underveisevaluering** | **1 310** |
| Uke 20: forhandling og signering | 1 310 |
| Uke 26: sluttevaluering | 1 473 |
| **= Rammen for hele planen** | **40 400** |

| STATUS FREDAG I UKE 12 | |
|---|---|
| Styrebesøk i planen | 10 |
| **Styrebesøk gjort** | **4** |
| Styrer som ikke svarte i uke 7 | 2 |
| **Uker til 30. juni** | **14** |



Til venstre planen styret vedtok i januar. Til høyre status i dag. Avstanden mellom dem er det økta handler om.

Handlingsplanen og statusen er casetall; timesatsen 327,43 kr står i faktaarket.

# Kari har ansvaret, og det er tiden hennes som er knapp




Gjennomføringen trenger penger og folk. Kari er også daglig leder og installatør.

REGELEN **Øverste ansvar: styret og daglig leder. Daglig ansvar: markedssjefen, eller en navngitt person (10.6).**

# Første linje: ansvaret er Karis, og tiden er knapp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ansvaret** | **Kari** | Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet. | RISIKO |
| **Taktikken** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |
| **Milepælen** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |
| **Evalueringen** | ? | *Ikke undersøkt ennå* | |

NESTE **Kan Kari endre noe uten å skrive en ny plan?**



# Målet står. Veien dit kan endres

LIGGER FAST

## Strategien

Mål og målgruppe: borettslag, kontrakt innen 30. juni.

KAN ENDRES

## Taktikken

Ti besøk, hvem som tar dem, hvilke styrer. Uke 12: Tom tar fire besøk, Ida tar mer av anbudskalkylen.

REGELEN **Strategien endres bare når rammene endres radikalt. Taktikken endres når noe uforutsett skjer (10.6).**

# Bare fire av ti styrebesøk er gjort i uke 12. Hva bør Kari gjøre nå?

## A Vente

HOLDER IKKE

I uke 26 er fristen 30. juni passert. Milepælen i uke 12 finnes nettopp for å rette avvik mens det er 14 uker igjen.

## B Justere

RIKTIG

Målet, kontrakt innen 30. juni, og målgruppen ligger fast. Besøkene er taktikk: Tom tar fire, Ida tar mer av kalkylen, så Kari får tid.

## C Ny plan

HOLDER IKKE

Strategien endres bare når rammene endres radikalt. To styrer som ikke svarte og et anbud er uforutsett, ikke et nytt marked.


REGELEN **Strategien ligger fast. Taktikken endres når noe uforutsett skjer (10.6).**

# Uke 12 avslører avviket 14 uker før fristen




Milepælen i uke 12 koster 1 310 kr. Uten den hadde Kari oppdaget avviket i juni.

REGELEN **Milepæl = uke + tall + hvem som sjekker. Avvik: juster taktikken nå, ikke i sluttevalueringen (10.7).**

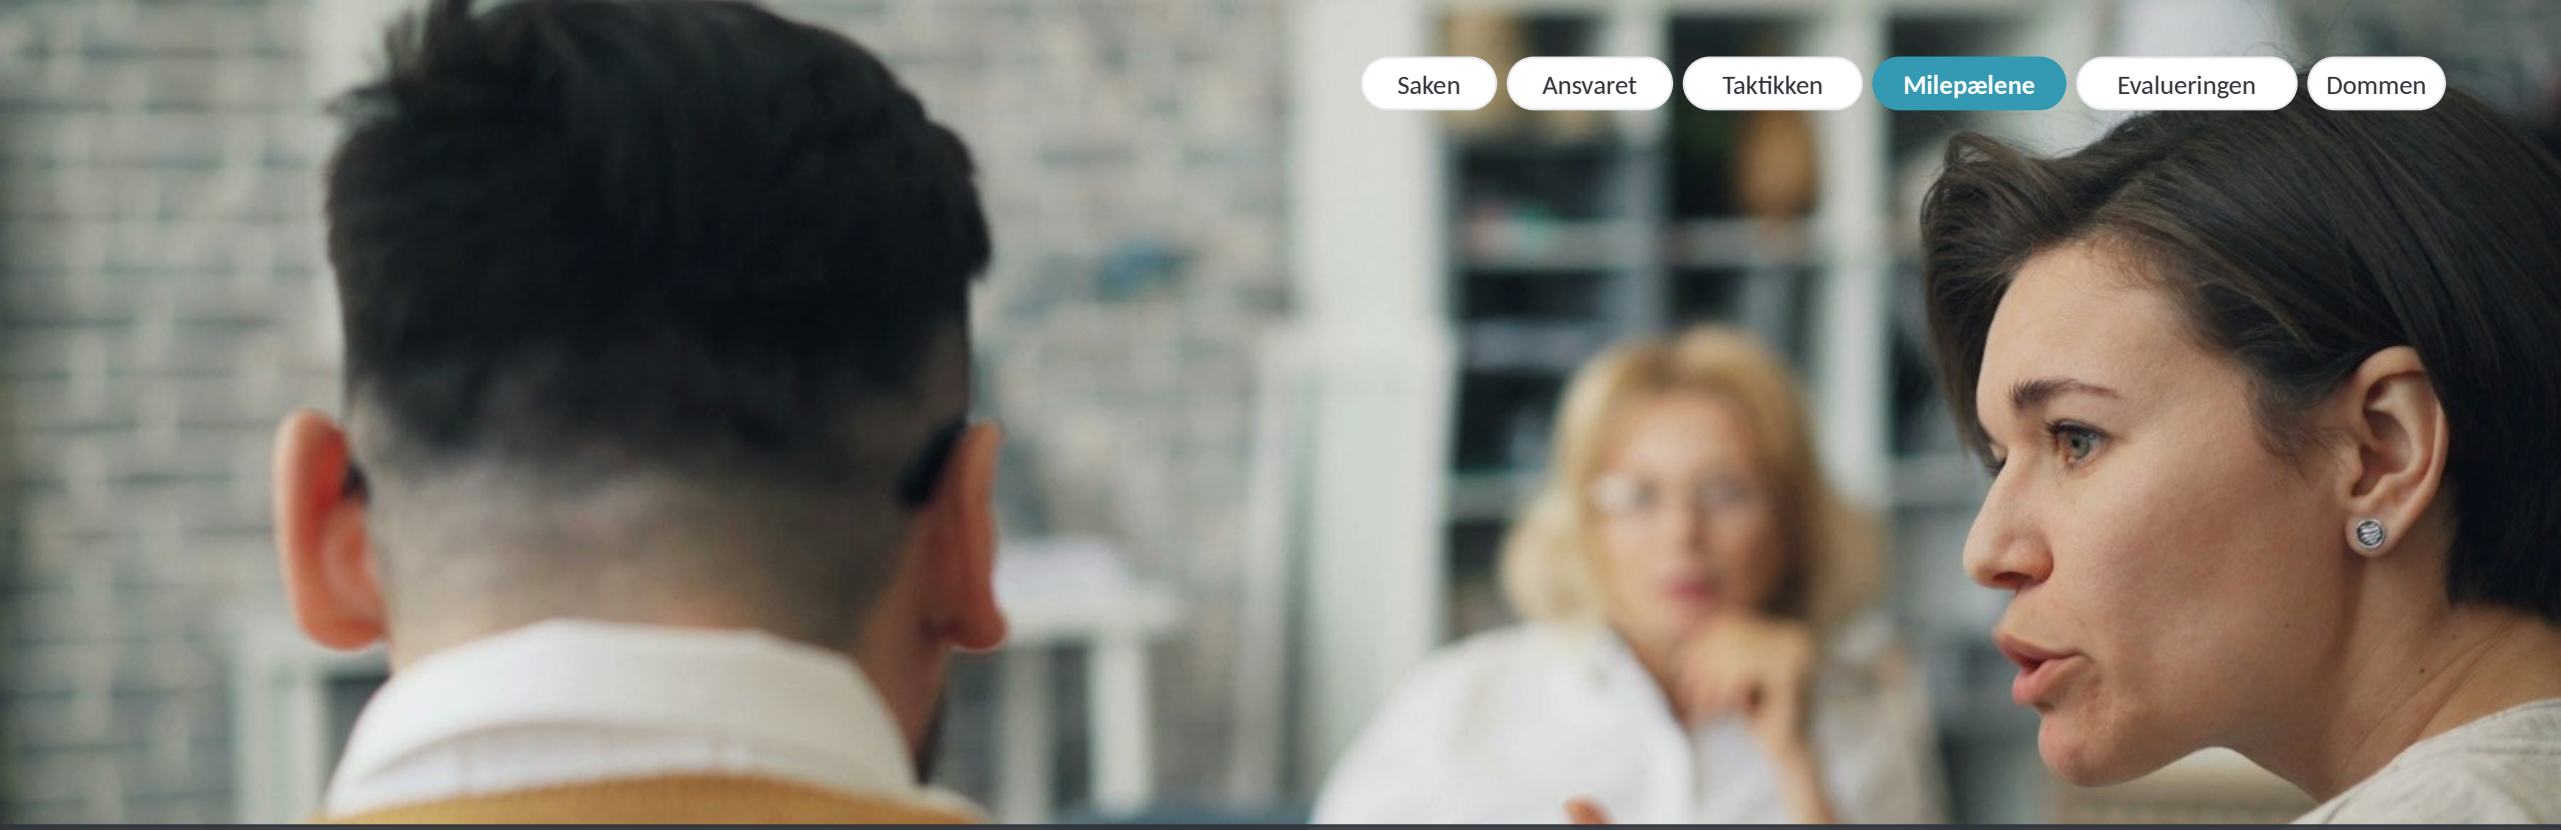

3 · MILEPÆLENE

# I januar ville styret kutte underveisevalueringen for å spare 1 310 kr. Kari sa nei.

# Slik finner du hva styret ville spare

**HVA ER DET?**


Hva oppstartsmøtet og underveisevalueringen koster, og hvor stor del det er av det som står på spill.

**HVORFOR REGNER VI DET UT?**

Styret ville spare penger. Men en kontroll underveis koster lite mot målet den beskytter, og den viser avvik mens det er tid.

**SLIK REGNER DU**

1 **Milepælen:** 4 × 327,43 = 1 310
2 **Begge linjene:** 8 960 + 1 310 = 10 270
3 **Av gevinsten:** 10 270 / 139 200 = 7,4 %



**HANDLINGSPLANEN: LINJENE STYRET VILLE KUTTE**

| | |
|---|---|
| Oppstartsmøte, 14 × 640 | 8 960 |
| Underveisevaluering, 4 × 327,43 | 1 310 |
| = Sparte styret | 10 270 |
| Ekstra DB på spill | 139 200 |

Kilde: handlingsplanen og arbeidsboka. 640 kr er Idas kalkylesats.

**7,4 %**

# Målet står, taktikken justeres

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ansvaret** | **Kari** | Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet. | RISIKO |
| **Taktikken** | **Tom** | Tom tar fire besøk. Ida tar mer av anbudskalkylen. | BRA |
| **Milepælen** | **4 av 10** | Avviket er synlig i uke 12, 14 uker før fristen. | BRA |
| **Evalueringen** | **?** | *Ikke undersøkt ennå* | |

NESTE **Ingen kontrakt, men 9 400 kr under rammen. Er det vellykket?**



# Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

DET VET VI

Rammen for planen er 40 400 kr. Målet er en kontrakt om et felles ladeanlegg innen 30. juni. Tenk dere at planen kostet 31 000 kr, og ingen styrer signerte.

## A Ja

Planen kostet 31 000 kr, 9 400 under rammen. Styret ville spare penger, og det ble gjort.

## B Nei

Målet var en kontrakt innen 30. juni. Uten kontrakt er de 31 000 kronene brukt uten at målet ble nådd.

## C Delvis

Målet glapp, men kostnaden holdt. Det ene veier opp for halvparten av det andre.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

# Ingen kontrakt i juni, men 9 400 kr under rammen. Er planen vellykket?

## A Ja

HOLDER IKKE

Under budsjett sier bare at det ble brukt lite. Vellykket er målet nådd innenfor rammen, og målet var kontrakten.

## B Nei

RIKTIG

Vellykket er to ting samtidig: målet nådd og innenfor rammen. Uten kontrakt er 31 000 kr brukt uten det planen skulle gi.

## C Delvis

HOLDER IKKE

Rammen er en grense, ikke et mål. Å bruke lite veier ikke opp for at kontrakten og 82 500 kr i dekningsbidrag uteble.

REGELEN **Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.**

# Billig er ikke det samme som vellykket

## A

**Én kontrakt i uke 20**

**38 000 kr**

Målet nådd innenfor rammen

## B

**Én kontrakt**

**46 000 kr**

Målet nådd, rammen sprakk med 5 600 kr

## C

**Ingen kontrakt**

**31 000 kr**

9 400 kr under rammen, men målet ikke nådd

## D

**Tre kontrakter**

**40 000 kr**

Overoppfylt: var målet for lavt?

Rammen er 40 400 kr. Utfallene er casetall.

REGELEN **Vellykket = målet nådd + innenfor rammen. Under budsjett uten mål er ikke vellykket.**

# Fire spørsmål før Kari konkluderer

**4**

**SPØRSMÅL, ETT FOR HVERT VIRKEMIDDEL**

«Kundene ville ikke» er sjelden hele svaret. Spørsmålene leder tilbake til punkt 4.

**Utfall C hos Nordlys: ingen kontrakt**

**Feil målgruppe?** kap. 5
For små borettslag, uten elbiler ennå?

**For svakt produkt?** kap. 6
Manglet trinnvis utbygging eller drift?

**Prisen dårlig brukt?** kap. 7
Var kvantumsrabatten synlig i tilbudet?

**Kommunikasjonen?** kap. 9
Fikk styret svar på befaringen?

REGELEN **Feil målgruppe? Svakt produkt? Prisen dårlig brukt? Kommunikasjonen sviktet? (10.7)**

# Notatet er ferdig: målet og rammen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ansvaret** | **Kari** | Daglig ansvar hos Kari. Tiden hennes går til anbudet. | RISIKO |
| **Taktikken** | **Tom** | Tom tar fire besøk. Ida tar mer av anbudskalkylen. | BRA |
| **Milepælen** | **4 av 10** | Avviket er synlig i uke 12, 14 uker før fristen. | BRA |
| **Evalueringen** | **40 400** | Vellykket er kontrakt innen 30. juni, innenfor rammen på 40 400 kr. | BRA |

NESTE **Sett sammen hele markedsplanen selv i oppgave 1C.**



JOBB NÅ

# 1C

## 20 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.



# Hele markedsplanen for solcelle og lading på én side

Punkt 1–2: forretningsidé, vekststrategi og situasjonsanalyse med tall

Punkt 3–4: hovedmål og delmål 1.3, og fem tiltak på de fem leddene

Punkt 5: handlingsplanens sum

Punkt 6–7: hva Kari gjør i uke 7 og uke 12, og fire utfall

Til slutt: hva lappen manglet

**Ferdig når**

Alle feltene fylt.
40 400 kr, fem grønne på leddene og fire på utfallene.
Alene, i par eller i gruppe.

# Planen Kari tar med til styret, og hva lappen manglet

**Punkt 1–3**

**+ 20 %**

Markedsutvikling. Fire ruter med tall. 20 plasser innen 30.6., Kari

**Punkt 4–5**

**40 400 kr**

Borettslag, felles anlegg, kvantumsrabatt, Polarlys, brev og besøk

**Punkt 6**

**Juster**

Uke 7: ring to andre. Uke 12 med 4 av 10: del besøkene

**Punkt 7**

**A B C D**

Nådd innenfor rammen, sprakk, ikke nådd, overoppfylt

Lappen manglet analysen, frist og ansvarlig på målet, uke, navn og budsjett på hvert tiltak, en sum styret kan si ja til, og milepæler.

# Markedsplanen i prosjektet ditt

1

## Hvilke av de sju punktene har dere?

Se på markedsdelen i prosjektoppgaven eller planen i bedriften. Hvilke punkter mangler helt?

2

## Har målene tall, frist og navn?

Skriv ett mål om slik at det har alle tre. Hva blir det i dekningsbidrag?

3


## Hvor ville dere satt en milepæl?

Hvilken uke, hvilket tall, og hvem sjekker? Hva gjør dere hvis tallet ikke er nådd?

REGELEN

**Uten uke, navn og sum er en markedsplan en lapp.**

# Sju punkter i fast rekkefølge

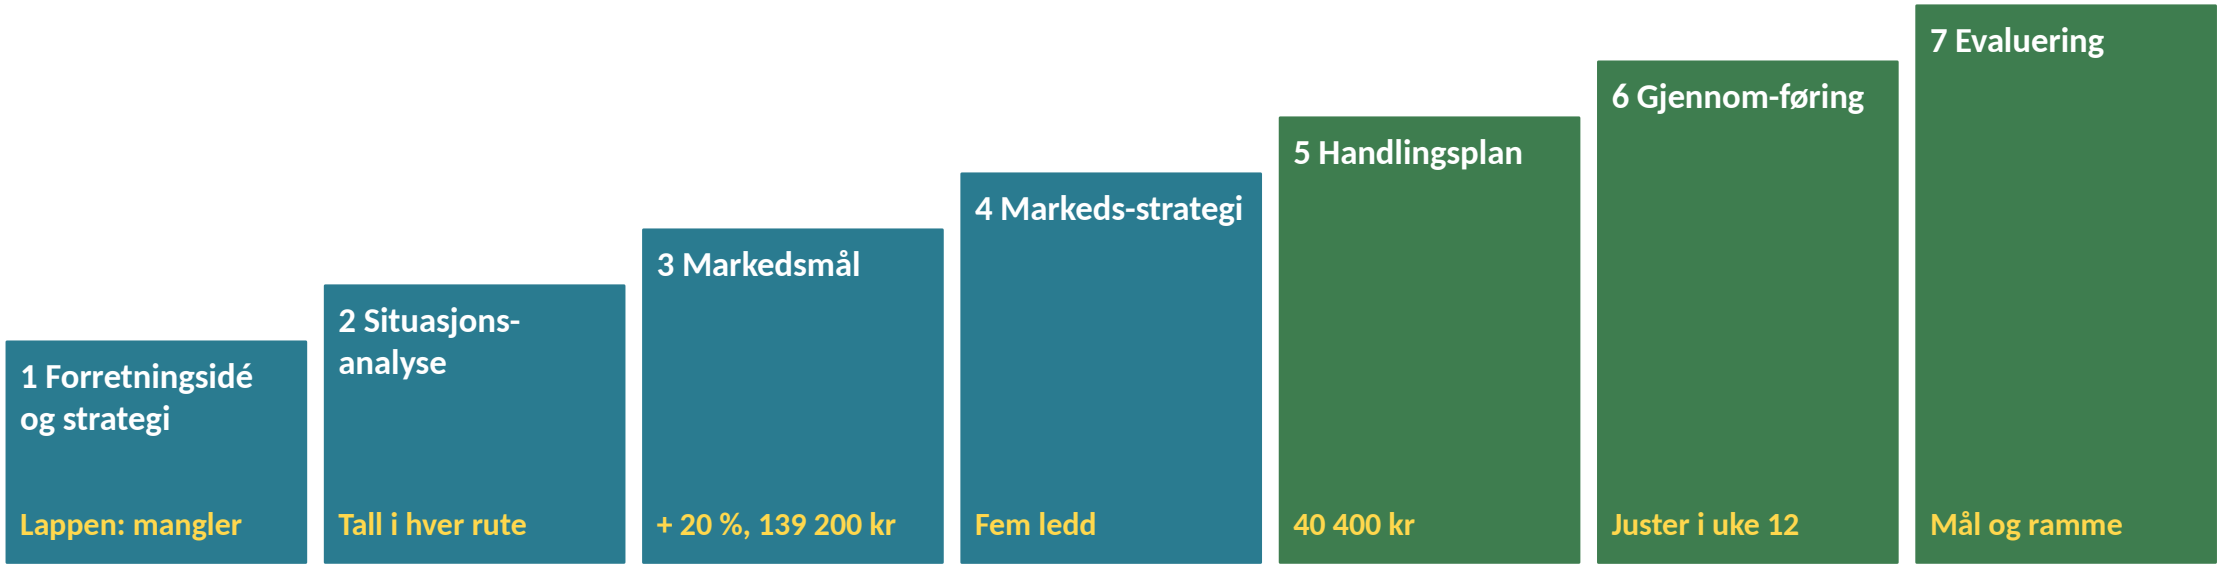


Analyse før mål, mål før tiltak, milepæler før evaluering. Det er markedsdelen av forretningsplanen i prosjektet ditt.

# Kari justerer i mars, så juni ikke blir en overraskelse

**4 av 10**

besøk i uke 12. Milepælen viste avviket mens det var 14 uker igjen.

**1 310 kr**

kostet milepælen. Det var den styret ville kutte.

**40 400 kr**

er rammen. Vellykket er kontrakten innenfor den.

SVARET

**Strategien ligger fast, taktikken justeres. Vellykket er målet nådd innenfor rammen.**

# Les, øv, og kan du forklare dette?

## Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.6 og 10.7. Repeter evalueringen av kampanjer i 9.11.

Arket for økta: alle reglene.

## Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Skriv markedsdelen av prosjektoppgaven din med alle sju punkter.

## Kan du forklare …

Hvem som har ansvaret for gjennomføringen.

Strategi fast, taktikk fleksibel.

Milepæler.

Fire utfall og fire spørsmål.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash (Marlene Céline Nordvik, Vitaly Gariev, Towfiqu barbhuiya, Andreea Avramescu).
