

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 16

Hvor stoppet beskjeden fra byggemøtet?

Tirsdag varslet Bygg AS en endring på byggemøtet. Fredag var kursene trukket etter den gamle tegningen.



FREDAG · KONTORBYGGET, 3. ETASJE · NORDLYS ELEKTRO AS

Referatet kom i dag. 45 timer må gjøres om, og varselet til Bygg AS er ikke sendt. Kommer det for sent, kan kravet gå tapt.



SAKEN · TIRSDAG · BYGGEMØTET HOS BYGG AS

Byggherren vil flytte kjøkkenet i tredje etasje

PROSJEKTLEDER I BYGG AS, PÅ BYGGEMØTET

«Elektro, rør og ventilasjon følger ny tegning. Endringsordre kommer.»

KARI NORDLUND, PÅ E-POST SAMME KVELD

«Mottatt, vi ser på det.»

SPØRSMÅLET

Fredag: 45 timer må gjøres om. Hvor stoppet beskjeden?

Beskjeden nådde aldri laget, og 45 timer må gjøres om. Hvem har skylda?

DET VET VI

Bygg AS sa på møtet tirsdag at elektro følger ny tegning. Kari svarte «Mottatt, vi ser på det», men sendte ingenting til laget. Referatet kom fredag.

A Bygg AS

Endringsordren og referatet kom først fredag. Så lenge ingenting er skriftlig, kan ikke Nordlys bygge etter den nye tegningen.

B Kari

Kari var på møtet og visste om endringen tirsdag. Hun sendte ikke beskjeden til Ronny og laget, og varslet ikke Bygg AS.

C Rutinen

Kari glemte, men Nordlys har ingen rutine for det som kommer ut av et byggemøte. Neste gang møter en annen, og det skjer igjen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 26

Slik blir 45 timer til 40 050 kroner

HVA ER DET?


Omarbeid: timer laget bruker på å trekke kjøkkenkursene på nytt etter den nye tegningen.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Ordreboka er full, så timene kunne vært fakturert et annet sted. Noe kan kreves inn gjennom endringsordren, men bare det som er varslet.

SLIK REGNER DU

1 **Per montør: 2 dager × 7,5 t = 15 t**
2 **Tre montører: 3 × 15 t = 45 t**
3 **Verdi: 45 × 890 kr = 40 050 kr**



RONNYS LISTE: OMARBEID I 3. ETASJE

Montør 1: 2 dager à 7,5 t	15 t
Montør 2: 2 dager à 7,5 t	15 t
Montør 3: 2 dager à 7,5 t	15 t
= Timer som må gjøres om	**45 t**
Timepris ut til kunde	**890 kr**
= Verdi med full ordrebok	**40 050 kr**

Kilde: saken; timeprisen fra faktaarket, Nordlys Elektro AS

40 050 kr

Første linje: hva det kostet

Timene	**45 t**	40 050 kr i omarbeid med full ordrebok.	RISIKO
Stoppet	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Kanalen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Rutinen	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hvor stoppet beskjeden fra byggemøtet?**



Fem spørsmål før vi kan svare Kari

1

Modellen

Hvor kan en beskjed stoppe?

2

Kanalen

Passet kanalen budskapet?

3

Kroppen

Hva hører de når ord og kropp sier to ting?

4

Bruddet

Avsender, medium eller mottaker?

5

Rutinen

Hva kan rettes én gang for alle?

Underveis regner og sorterer dere i oppgave 1B. Alle begreper og regler står på arket for økta.

Boka sier medium. Bransjen sier kanal

Medium	=	**Kanal: telefon, tekstmelding, e-post, Teams, byggemøtet**
Systematisk tilbakemelding	=	**Kvittering, «gjenta tilbake», bekreftelse**
Formell kommunikasjon	=	**Byggemøtereferat, endringsordre, varsel, avviksmelding (RUH)**

Ordene til høyre hører du på bygget. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Avsender koder, mediet bærer, mottaker dekoder

Støy: fysisk (lett å fjerne) og psykisk (tidspress, konflikter)



REGELEN **Avsender koder → medium bærer → mottaker dekoder → eventuelt videre. Hvert ledd kan svikte (16.2).**

Slik leser du byggemøtereferatet

HVA ER DET?

Referatet er det formelle mediet fra byggemøtet. Det viser hva som ble sagt, av hvem, og hvem som skal gjøre hva.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Referatet er ikke endringsordren. En endring i kontrakten krever skriftlig endringsordre fra Bygg AS eller skriftlig varsel fra Nordlys (NS 8415).

SLIK REGNER DU

1. **Hva skal Nordlys gjøre? Følge ny tegning**
2. **Hva mangler? Endringsordren «kommer»**
3. **Når kom papiret? Fredag, tre dager etter**



REFERAT FRA BYGGEMØTET, TIRSDAG (UTDRAG)

Sak: kjøkkenet i 3. etasje

Byggherren flytter kjøkkenet

Elektro, rør og ventilasjon følger ny tegning	
Endringsordre kommer	**Bygg AS**
Referatet sendt ut	**fredag**

Utdraget er laget til saken; Bygg AS er en tenkt entreprenør

Tirsdag sagt, fredag skrevet

To veier ut fra Kari. Begge stoppet hos henne

UT TIL BYGG AS

Intet varsel

«Mottatt, vi ser på det.» Ingen pris, ingen konsekvens for framdriften, og selve endringen er ennå ikke priset.

INN TIL RONNY OG LAGET

Ingen beskjed

Laget hadde den gamle tegningen og trakk kjøkkenkursene etter den. 45 timer må gjøres om.

REGELEN **Hver mottaker blir avsender når beskjeden skal videre. Da kan den stoppe igjen.**


Beskjeden stoppet hos Kari, to veier

Timene	**45 t**	40 050 kr i omarbeid med full ordrebok.	RISIKO
Stoppet	**Hos Kari**	Intet varsel ut til Bygg AS, ingen beskjed inn til laget.	SVAK
Kanalen	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Rutinen	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Passet kanalen til budskapet?**



Det uvanlige tar du direkte og toveis

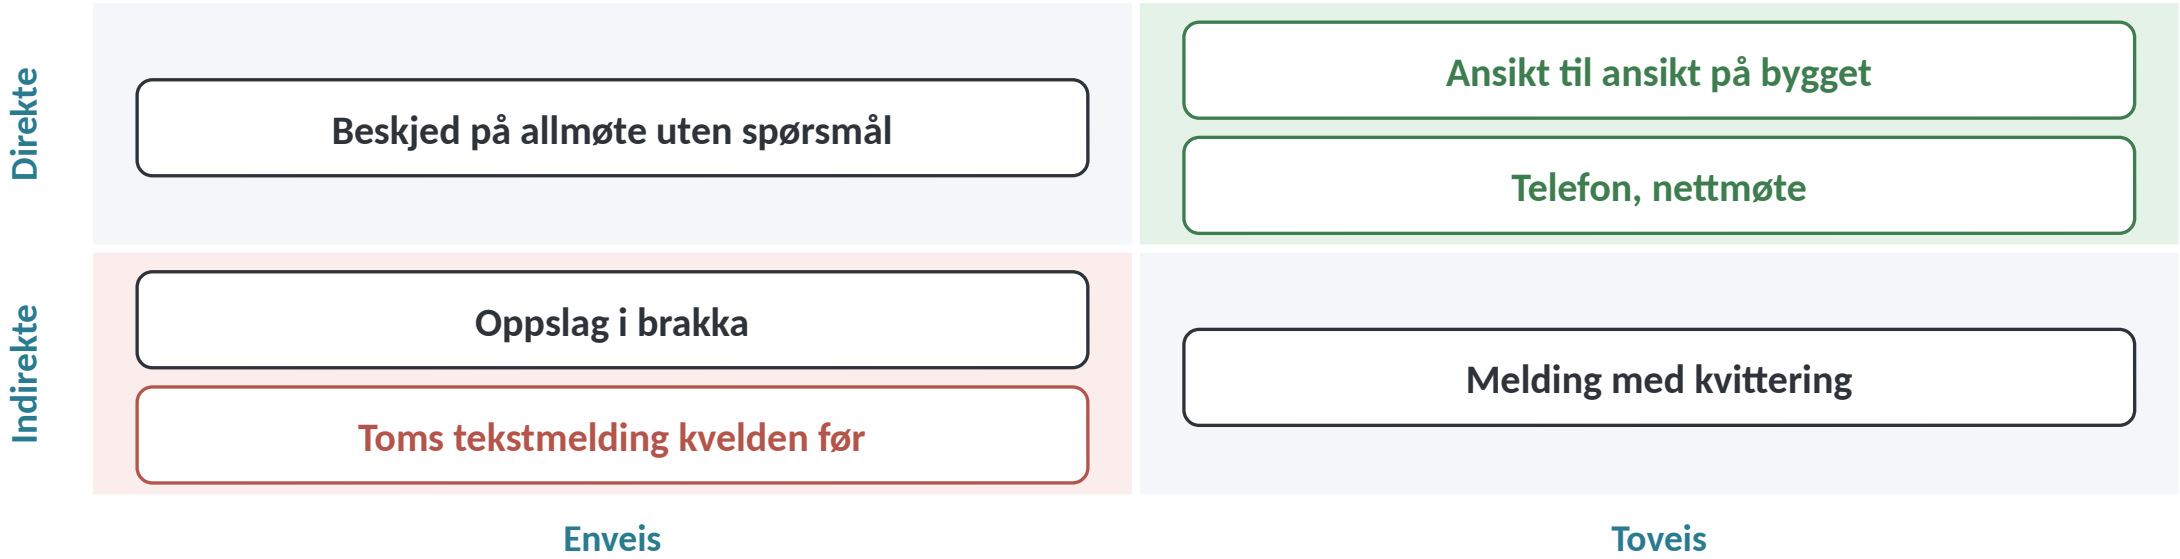

REGELEN **Direkte eller indirekte: møtes partene? Enveis eller toveis: kan mottakeren svare med en gang? (16.2.1)**

Praten forbereder. Det skriftlige kan du vise til

FORMELL

Skriftlig


Referat, endringsordre og varsel. Sporbart. En endring i kontrakten krever endringsordre fra Bygg AS eller varsel fra Nordlys.

UFORMELL

Praten

Bilen, brakka og lunsjen. Rask og bygger tillit, men ingen kan vise til den når entreprenøren spør.


REGELEN **Formell støtter effektiviteten, uformell bygger relasjonene. Alt til sin tid (16.2.1).**

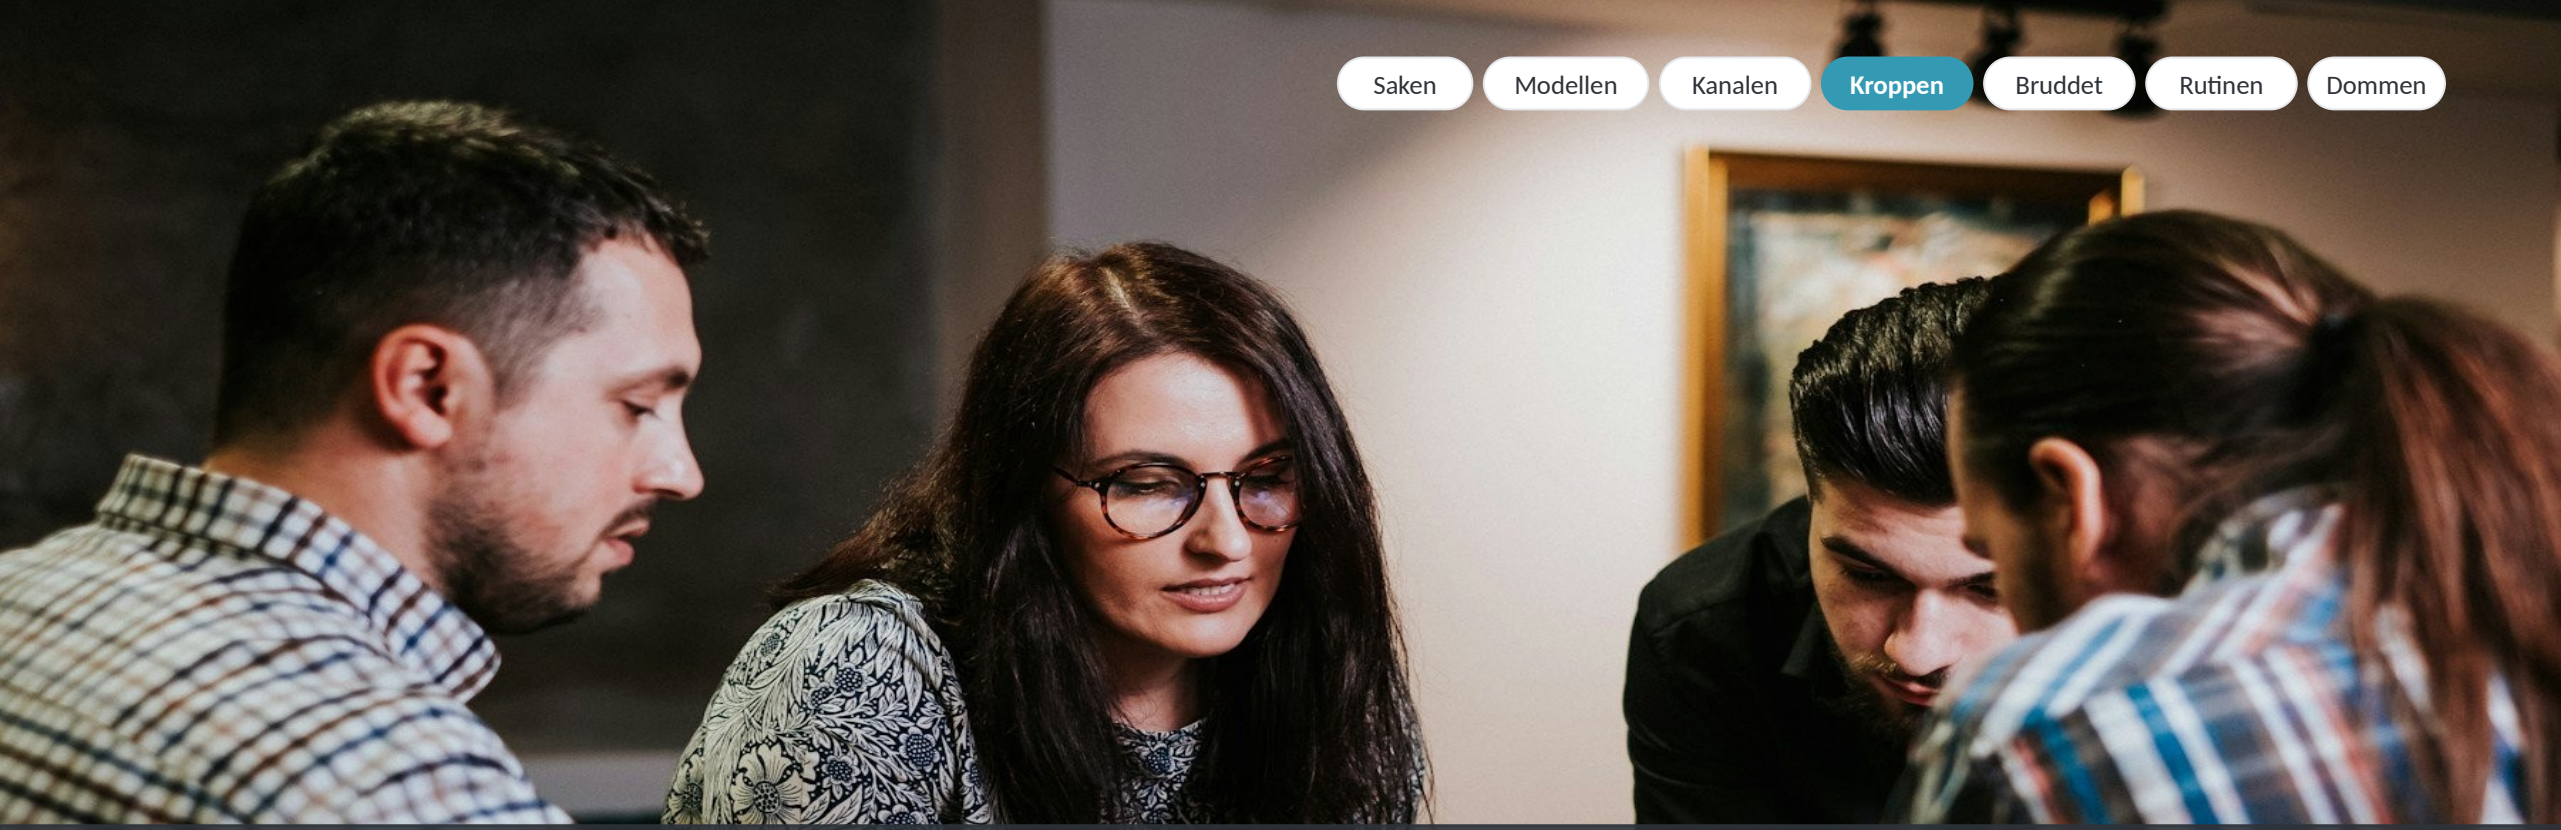

3 · KROPPEN: MANDAGSMØTET HOS FJELL ELEKTRO

«Døra mi er alltid åpen», sier Mona, med blikket på mobilen.

Når ord og kropp sier to ting, trenger kroppen gjennom

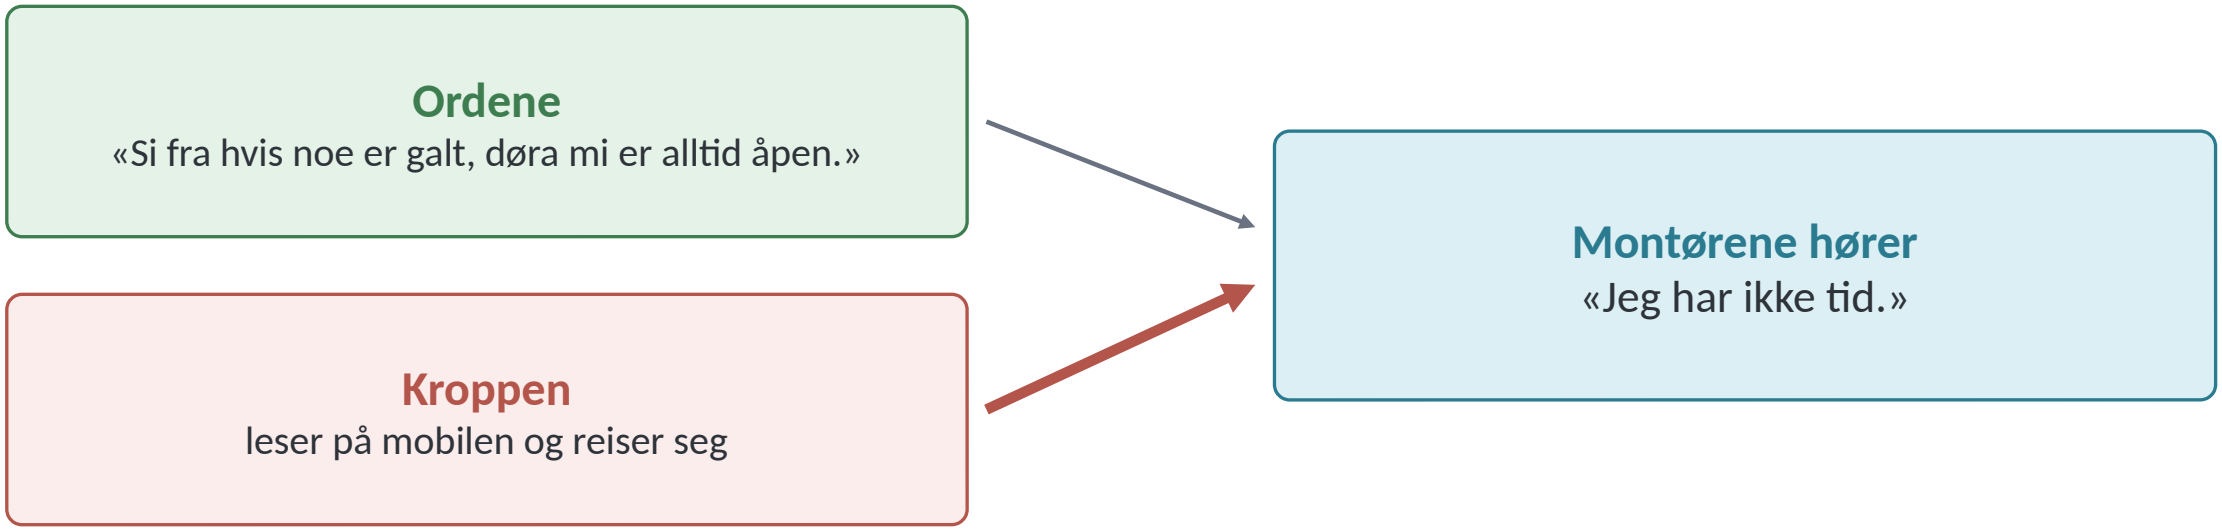

En montør sier senere: «Mona spør aldri hvordan det går med oss.» Hun mente det hun sa. Det var kroppen som ble hørt.

REGELEN **Dobbeltkommunikasjon: å si én ting og gjøre noe annet. Det nonverbale trenger gjennom, og tilliten svekkes (16.2.1).**

Kunden sa mye. Meldingen sa fem ord

HVA ER DET?

Andelen servicebesøk som måtte gjøres på nytt i vårhalvåret, og hva de kostet med full kalender.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Tom Berg sier at montørene ikke leser meldingene ordentlig. Tallene viser hvor stort problemet er, ikke hvor feilen ligger.

SLIK REGNER DU

1 **Andel: 9 / 105 × 100 = 8,6 %**
2 **Timer: 9 besøk × 3 t = 27 t**
3 **Tapt fakturering: 27 × 890 kr = 24 030 kr**



TOMS MELDING OG SERVICELOGGEN

Kunden i telefonen	
Jordfeilen er i garasjen	
Skapet står i kjelleren	
Toms melding kvelden før	
«Jordfeil, Haugveien 12, kl. 8»	
Servicebesøk i vårhalvåret	105
Gjort på nytt	**9**

Kilde: saken og oppgave 1B

8,6 %

Tom: «De leser ikke meldingene ordentlig.» Hvor ligger feilen?

DET VET VI

Kunden sa garasjen og skapet i kjelleren. Tom sendte «Jordfeil, Haugveien 12, kl. 8» kvelden før. 9 av 105 besøk måtte gjøres på nytt.

A Montøren

Montørene må lese meldingene bedre. Adressen og klokkeslettet sto der; resten kan de spørre kunden om når de kommer fram.

B Tom og mediet

Tom kodet det kunden sa om til fem ord, og sendte det som en enveis melding montøren ikke kan svare på før han kjører.

C Kunden

Kunden forklarte dårlig. Hadde kunden sagt tydelig hvor feilen var, hadde Tom fått det riktig i meldingen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 19

Tom: «De leser ikke meldingene ordentlig.» Hvor ligger feilen?

A Montøren

HOLDER IKKE

Montøren leste det som sto der. Fem ord sier ikke garasjen eller kjelleren. Leter du bare hos mottakeren, finner du halve feilen.

B Tom og mediet

RIKTIG

Avsenderen koder, mediet bærer. Tom kodet bort det viktigste, og tekstmeldingen er enveis. Begge deler kan Tom rette selv.

C Kunden

HOLDER IKKE

Kunden sa både at feilen er i garasjen og at skapet står i kjelleren. Beskjeden var god da den kom inn; den ble kort på vei ut.

REGELEN **Sjekk deg selv som avsender først: hva kodet du bort, og kan mottakeren svare?**

Leter du bare hos mottakeren, finner du halve feilen

9 av 105

SERVICEBESØK GJORT PÅ NYTT I VÅRHALVÅRET

Kunden forklarte garasjen og skapet i kjelleren. Tom sendte fem ord: «Jordfeil, Haugveien 12, kl. 8».

Bokas årsaker til brudd, ledd for ledd (16.3)

Hos avsenderen
egen tolkning, vag og utydelig, vanskelig språk, dobbelt-kommunikasjon

Støy
fysisk: lett å fjerne
psykisk: tidspress, konflikter

Hos mottakeren
selektiv, sympatier og antipatier, dårlig lytter

REGELEN **Avsender: fire årsaker. Mottaker: tre. Mellom dem: støy. Sjekk deg selv som avsender først.**

Et «ok» er ikke en bekreftelse

MONTØREN SVARER

«Ok»

Tom vet at meldingen er lest. Han vet ikke hva montøren har forstått.

MONTØREN GJENTAR

Kvittering

«Haugveien 12, garasjen, skapet i kjelleren.» Nå vet begge at budskapet er forstått.

REGELEN **Systematisk tilbakemelding: mottakeren bekrefter ved å gjenta hovedinnholdet (16.4).**

Rett rutinen, ikke bare personen

1 Kari svarer
«mottatt, vi ser på det»

→

2 Intet varsel
om pris og framdrift til Bygg AS

→

3 Ingen beskjed
til Ronny og laget

Personfeil: neste gang møter en annen, og det skjer igjen.

Systemfeil: ingen rutine for det som kommer ut av byggemøtet
Samme dag: tegningen skriftlig til formannen, som kvitterer, og skriftlig varsel til entreprenøren.

REGELEN **Personfeil: rett personen, og feilen kommer igjen. Systemfeil: rett rutinen, og den er rettet for alle.**

Avviket og rutinen er skrevet

Timene	**45 t**	40 050 kr i omarbeid med full ordrebok.	RISIKO
Stoppet	**Hos Kari**	Intet varsel ut til Bygg AS, ingen beskjed inn til laget.	SVAK
Kanalen	**Muntlig**	Møtet var muntlig, referatet kom etter tre dager.	SVAK
Rutinen	**Samme dag**	Skriftlig til formannen med kvittering, og varsel til Bygg AS.	BRA

NESTE **Varselet går til Bygg AS i dag. Rutinen gjelder fra neste byggemøte.**



JOBB NÅ

1B

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 16 → Filer → OL16_Grupper_kommunikasjon_konflikt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Beskjeden som ble borte, og det Mona sier uten ord

a–b Nordlys: andelen besøk gjort på nytt, og tapt fakturering

c Leddet i modellen som sviktet

d Fem tiltak: ja eller nei etter boka?

e Mona med mobilen: hva skjer?

f Hva koster mandagsmøtet i fakturerbar tid?

g Skriv svaret til Tom, med navn, handling og frist

Ferdig når

Grønne sjekker i a til f.
I g bruker du ordene enveis og tilbakemelding, og ett tall.
Alene, i par eller i gruppe.

8,6 % av besøkene, 24 030 kr, og et møte til 61 410 kr

a · Gjort på nytt

8,6 %

9 / 105 × 100

b · Tapt fakturering

24 030 kr

9 × 3 × 890, vårhalvåret

f · Mandagsmøtet

61 410 kr

3 × 0,5 × 46 × 890 per år

c: kodingen og mediet. d: ja til å gjenta, fast mal og telefon om det uvanlige; nei til hele samtaleloggen og «les bedre». e: det nonverbale trenger gjennom. g: feilen er like mye hos avsender og medium; montøren bekrefter oppdraget før han kjører.

Beskjeden nådde aldri laget, og 45 timer må gjøres om. Hvem har skylda?

A Bygg AS

HOLDER IKKE

Bygg AS sa det på møtet tirsdag. Referatet kom sent, men Nordlys skulle selv varslet skriftlig om pris og framdrift.

B Kari

HOLDER IKKE

Beskjeden stoppet hos Kari, begge veier. Men retter vi bare personen, skjer det igjen neste gang en annen møter for Nordlys.

C Rutinen

RIKTIG

Systemfeil: ingen rutine for det som kommer ut av byggemøtet. Samme dag skriftlig til formannen med kvittering, og varsel til Bygg AS.

REGELEN **Rett rutinen, ikke bare personen: da er feilen rettet for alle som møter neste gang.**

Beskjeden stoppet hos Kari, men feilen er rutinen

45 t

40 050 kr i omarbeid. Nordlys bærer den delen som skyldes at beskjeden stoppet.

2 veier

Varsel ut til Bygg AS og beskjed inn til laget. Begge stoppet.

1 rutine

Samme dag skriftlig til formannen med kvittering, og skriftlig varsel til entreprenøren.

SVARET

Svaret: rett rutinen, og la mottakeren gjenta. Et «ok» er ikke en bekreftelse.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 16: 16.2, 16.2.1, 16.3 og 16.4.

Arket for økta: alle begrepene med eksempler.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 16 → Øv og Prøv.

Finn én beskjed som stoppet på din arbeidsplass, og si hvilket ledd den stoppet i.

Kan du forklare ...

Kommunikasjonsmodellen.

De fire skillene, og dobbeltkommunikasjon.

Årsaker til brudd, og tiltak fra boka.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 16. Standard Norge: NS 8405, NS 8407, NS 8415 og NS 8417 (endringsordre og varsel). Bygg AS er en tenkt entreprenør. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; historiene, timene og sakene er casefakta for kapittel 16. Foto: Unsplash (RONNAKORN TRIRAGANON, Andreea Avramescu, Glenov Brankovic, Towfiqu barbhuiya, Mathias Reding).
