

ØKT 2 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 10

Hvem gjør hva, i hvilken uke, og hva koster det?

Kari har punkt 1–4 klart. Nå vil styret se handlingsplanen.

Fagskolen Oslo



SAKEN · 15. JANUAR 2027 · STYREMØTET

Styret vil vite hvem, når og hvor mye

KARI, DAGLIG LEDER

«Vi skal vokse 20 %, og innen 30. juni skal vi ha et felles ladeanlegg i et borettslag.»

STYRELEDER

«Hvem gjør det, i hvilken uke, og hva koster det? Og bærer det seg?»

SPØRSMÅLET **Hva koster planen, regnet med timene?**

Fagskolen Oslo

Hvor mye av planens kostnad tror dere er egne timer?

A

0 %

bare utleggene teller

B

50 %

halvparten

C

85 %

det meste

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fire spørsmål før styret sier ja

1

Planen

Hva skiller strategi fra handlingsplan?

2

Timene

Hvorfor regne med egne timer?

3

Summen

Ni linjer: hva koster planen?

4

Gevinsten

Bærer planen seg?

Underveis regner dere selv i oppgave 1B. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Prosjektledere og styret bruker andre ord enn boka

Handlingsplan	=	Tiltaksliste med eier og frist
Milepæl	=	Statusmøte, kontrollpunkt
Markedsplan	=	Markedsdelen av forretningsplanen
Dekningsbidrag	=	DB, timebidrag

Ordene til høyre møter du i banken, i styret og på prosjektene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Strategien varer i år. Planen sier hvem og når

STRATEGI · PUNKT 1–4

År

Borettslag over 20 leiligheter, felles ladeanlegg, kvantumsrabatt, brev og besøk. Ligger fast.

HANDLINGSPLAN · PUNKT 5

Uker

Uke 6: Ida skriver brevet. Uke 8–11: Kari og Tom tar ti besøk. Og hva hver linje koster.


REGELEN **Strategi: hva og hvorfor, i år. Handlingsplan: hvem gjør hva, i hvilken uke, for hvor mye (10.5).**

Bygghandels vårkampanje: intern før ekstern

Uke 5	Idémyldring i ledergruppen	6 000
Uke 6–7	To møter med reklamebyrå	34 000
Uke 8	Kampanjemateriell trykkes	120 000
Uke 8	Infomøte med alle butikksjefer	35 000
Uke 9	Kick-off for vårkampanjen	140 000
Uke 10–13	Underveis- og sluttevaluering	22 000
Sum	regnet ut; står ikke i boka	357 000

Hver linje har uke, aktivitet, mål, målgruppe, budsjett og ansvarlig. Infomøtet kommer før kick-off.

REGELEN **Hver linje: uke + aktivitet + mål + budsjett + ansvarlig. Skriv alltid summen.**

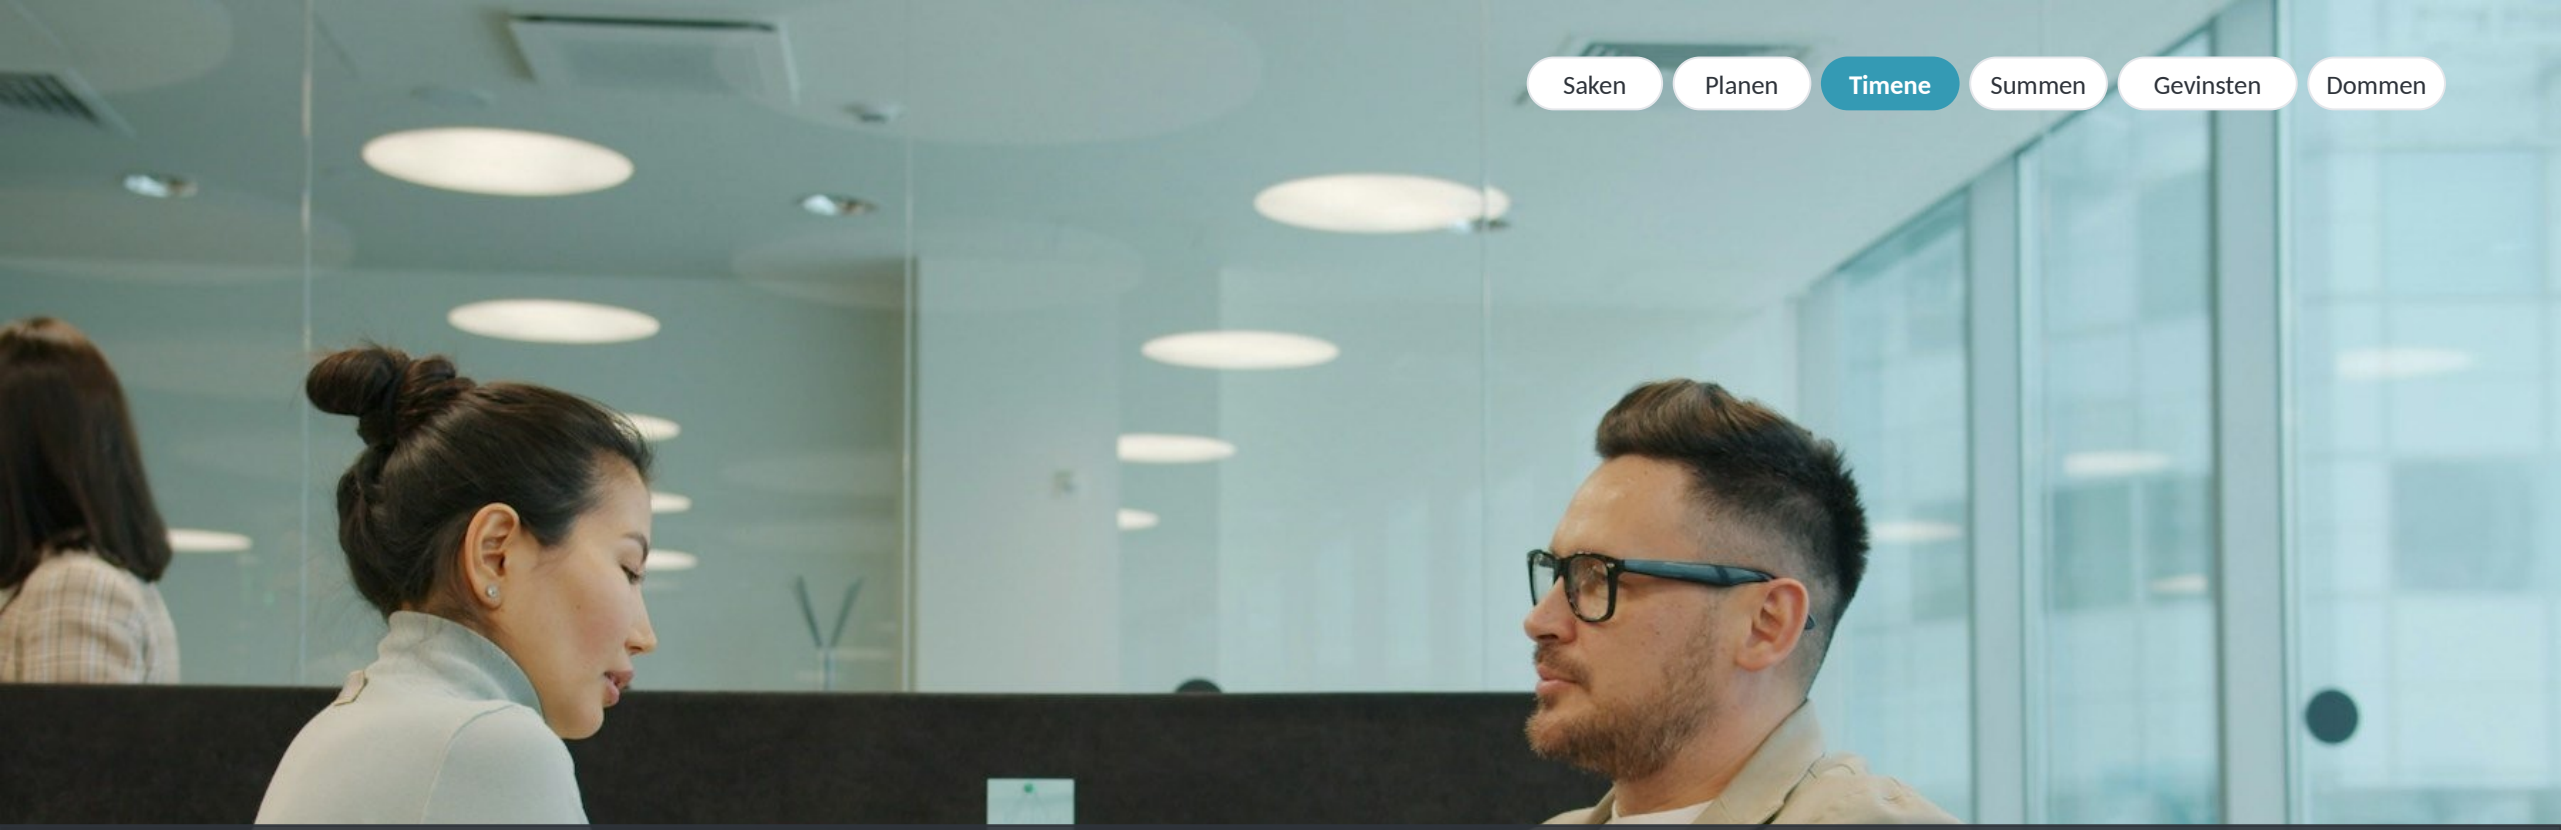

2 · TIMENE

Tom: «Styrebesøkene koster jo bare kjøring, 4 000 kr.» Hører timene med i budsjettet?

Hva koster de ti styrebesøkene?

A

4 000 kr

bare kjøringen

B

12 606 kr

bare timene

C

16 606 kr

timer og kjøring

38,5 administrasjonstimer à 327,43 kr og 4 000 kr i kjøring.

Regn timene med i budsjettet

BARE UTLEGGET

~~4 000 kr~~

Kjøringen. At planen tar 38,5 timer av Kari og Tom, synes ikke.

BUDSJETTPOSTEN

16 606 kr

38,5 t × 327,43 kr + 4 000 kr. Lønna løper uansett; timene viser hva planen tar av tiden deres.

REGELEN **Budsjettpost = timer × lønnskostnad per time + utlegg. 2 220 000 / (4 × 1 695) = 327,43 kr**

Ni linjer for ladeanlegget, med uke, navn og kroner

Uke 3	Idémyldring i ledermøtet	6 t	**1 965**	Kari
Uke 4	Kartlegging av borettslag	10 t	**3 274**	Ida
Uke 5	Oppstartsmøte, 18 ansatte	14 m	**8 960**	Kari, Tom
Uke 6	Brev til 24 styreledere	5 t + 1 900	**3 537**	Ida, Kari
Uke 7	Telefon til styrelederne	6 t	**1 965**	Kari
Uke 8–11	Ti styrebesøk	38,5 t + 4 000	**16 606**	Kari, Tom
Uke 12	Underveisevaluering	4 t	**1 310**	Kari, Ida
Uke 20	Forhandling og signering	4 t	**1 310**	Kari
Uke 26	Sluttevaluering	4,5 t	**1 473**	Kari, Ida
Sum			**40 400**	

REGELEN **Sum = 78 adm.timer × 327,43 + 14 montørtimer (m) × 640 + 5 900 kr i utlegg = 40 400 kr**

85 % av planen er timer

85 %

AV 40 400 KR ER EGNE TIMER

Utleggene er bare 5 900 kr: trykk, porto og kjøring.

Planen fordelt på timer og utlegg



Administrasjon	78 × 327,43	**25 540**
Montører	14 × 640	**8 960**
Utlegg	1 900 + 4 000	**5 900**

Med full kalender ville en montørtime kostet 890 kr i tapt fakturering.

REGELEN **34 500 / 40 400 = 85 %. Oppstartsmøtet legges der timene ellers står ledige.**

Planen spiser 29 % av gevinsten

29,0 %

AV DET EKSTRA DEKNINGSBIDRAGET

Mot hele gevinsten i delmålene. Ladeanlegget alene gir 20 × 4 125 = 82 500 kr: planen er 49 % av det.

40 400 kr mot 139 200 kr



Andel av gevinsten	40 400 / 139 200	**29,0 %**
Igjen ved 75 %	0,75 × 139 200 − 40 400	**64 000 kr**
Grensen	planen bærer seg over	**29 %**

REGELEN **Andel = planens sum / ekstra DB × 100. Igjen = andel nådd × ekstra DB − planens sum**

JOBB NÅ

1B

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Filer → MA10_Markedsplanen_oppsummert_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle reglene.

Handlingsplanen for ladeanlegget: hva koster den?

Fyll inn budsjettet for de ni linjene: timer × timesats + utlegg

a Hvor stor del av 139 200 kr planen bruker

b Hva som er igjen ved 75 % måloppnåelse

c Hører seks utsagn hjemme i en handlingsplan?

d Svar styret, som vil kutte oppstartsmøtet og underveisevalueringen

Ferdig når

Ni grønne linjer og 40 400 kr.
29,0 % og 64 000 kr.
Svaret til styret får «Bra» i sjekken.

40 400 kr, 29,0 % og 64 000 kr igjen ved 75 %

Summen

40 400 kr

78 × 327,43 + 14 × 640 + 5 900

a · Andel

29,0 %

40 400 / 139 200

b · Igjen ved 75 %

64 000 kr

0,75 × 139 200 − 40 400

c · Hører hjemme

3 ja, 3 nei

Ja: brevet, uke 12 og oppstartsmøtet. Nei: de tre andre

Til styret: oppstartsmøtet er intern markedsføring før ekstern, og uke 12 er milepælen som viser avvik mens det er tid. 10 270 kr er 7,4 % av de 139 200 kronene som står på spill.

Kunden henter tre tilbud. Planen må stå i ditt

Forbrukerrådgiverne ber kunden hente

3 tilbud

Og sjekke Elvirksomhetsregisteret. Tilbudet ditt blir alltid sammenliknet med to andre.

Veier inn til lokale installatører

4 veier

Søk på nett, anbudstjenester, rammeavtaler med borettslag og sameier, og omdømme.

Fjell Elektros markedsføring første år

40 000 kr

Monas handlingsplan bruker 37 840 kr, med sum, uke og navn på hver linje.

Kruttverket og Etablering av el-bedrift: markedsdelen er de sju punktene, med handlingsplan, sum og milepæler.

REGELEN **Særpreget må stå i tilbudet, ikke bare på bilen. Uten uke, navn og sum er planen en lapp.**

Planen koster 40 400 kr, og den bærer seg

40 400 kr

for ni linjer med uke, navn og kroner. 85 % er egne timer.

29,0 %

av det ekstra dekningsbidraget i delmålene. Mot ladeanlegget alene, 82 500 kr: 49 %.

64 000 kr

er igjen selv om bare 75 % av målene nås.

SVARET

Uke, navn og kroner på hver linje. Regn timene med, selv om lønna løper uansett.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 10: 10.5 med tabell 10.1. Repeter kampanjebudsjettet i 9.11.

Økonomistyring kapittel 7: dekningsbidrag.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 10 → Øv og Prøv.

Sett opp tre linjer i en handlingsplan for et tiltak i bedriften din, med timer.

Kan du forklare ...

Strategi og handlingsplan.

En handlingsplan med uke, aktivitet, budsjett og ansvarlig.

En budsjettpost med timer og utlegg.

Om en plan bærer seg.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 10. Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring, kap. 2 og 7. Smarte Penger: kjøpeguide «Elektriker». Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og handlingsplanen, milepælene og utfallene er casetall. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).
