

ØKT 3 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 15

Kan service og prosjekt ledes likt?

Kari vil la Tom og Ronny bytte avdeling. Samme uke vinner Nordlys et oppdrag som trenger folk fra alle tre.



Kari vil ha nye øyne på driften

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Tom og Ronny bytter avdeling. Vi trenger nye øyne på driften.»

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Service er vaktliste og småjobber. Ronnys jobb er framdriftsplaner.»

SPØRSMÅLET **Er det samme jobb å lede de to avdelingene?**

Går det bra om Tom og Ronny bytter avdeling?

A

Ja

en god leder kan lede hva som helst

B

Nei

oppgavene er for ulike

C

Kanskje

hvis de får lære den nye jobben

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fem spørsmål før vi kan svare Kari

1

Situasjonen

Hvorfor ledes ikke service og prosjekt likt?

2

Delene

Hvordan ser Nordlys ut i Mintzbergs figur?

3

Typene

Hvor ligger myndigheten?

4

Prosjektet

Hva gjør en jobb til et prosjekt?

5

Matrisen

Hvem avgjør når alle vil ha samme montør?

Underveis plasserer og regner dere i oppgave 1C. Alle begreper og regler står på arket for økta.

Mintzberg sier operativ kjerne. Bransjen sier de som er ute

Operativ kjerne	=	**Montørene, produksjonen, «de som er ute»**
Teknostruktur	=	**Kalkyle, prosjektkontor, KS- og HMS-ansvarlig**
Prosjekt og matrise	=	**Entreprise, prosjektleder og avdelingsleder, «utlån av montører»**

Ordene til høyre hører du på jobben. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Én entreprise tilsvarer 133 serviceoppdrag

133

SERVICEOPPDRAG PÅ ÉN ENTREPRISE, I TIMER

800 / 6 = 133. Service: mange små, kjente oppdrag. Prosjekt: få store engangsoppgaver.

To avdelinger, to situasjoner

Service (Tom)	Prosjekt (Ronny)
210 × 6 t	9 × 800 t
oppdrag i året × timer	entrepriser i året × timer
Vaktliste, responstid, sjekklister	Framdriftsplan, byggemøter, samordning med andre fag

REGELEN **Mintzberg (15.6): arbeidsdeling og samordning, alltid. Formen må passe situasjonen.**

Fem ting i situasjonen avgjør formen

Alder
stiftet 2019, vokst ut av startformen

Størrelse
18 ansatte: skrevne ansvarsforhold trengs

Produksjons-teknologi
arbeidskraft-intensiv

Maktforhold
erfarne montører er knappe

Omgivelser
kjeder og andre installatører presser prisene

Det mangler 1 110 elektrikere i Norge (NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026). Etter Mintzberg gir knappheten de erfarne montørene makt.

REGELEN **Alder · størrelse · produksjonsteknologi · maktforhold · omgivelser (15.6)**

Nordlys i Mintzbergs figur: 14 av 18 i kjernen

Toppledelsen: 1
Kari

Teknostruktur: 1
Ida: kalkyle og normtider

Mellomledelsen: 2
Tom og Ronny

Støttestruktur: 0
kjøpt utenfra: regnskap, lønn, IT

Operativ kjerne: 14
12 montører og 2 lærlinger

1 + 2 + 1 + 14 + 0 = 18 ansatte

REGELEN **Linjen: toppledelse, mellomledelse, operativ kjerne. Stab: teknostruktur og støttestruktur (figur 15.1).**

Ida er viktig, men hun leder ingen

IDA HAUGEN

Teknostruktur

Justerer normtidene i kalkylen etter etterkalkylene. Former arbeidet til alle 14, men gir ingen ordre.

RONNY FJELD

Mellomledelse

Fordeler montørene, leder 6 montører og 1 lærling, gir ordre og følger opp.


REGELEN **Leder folk og gir ordre: mellomledelse. Planlegger og styrer uten å lede folk: teknostruktur.**

Én bedrift kan ha flere former

Fjell Elektro Entreprenør-organisasjonen	**Nordlys service** Maskinbyråkratiet	**Nordlys prosjekt** Den innovative organisasjonen
Mona og to montører. Mona står for 700 av 3 500 fakturerbare timer: 20 %.	**210 kjente oppdrag i året, vaktliste og sjekklister.**	**9 engangsoppgaver i året, hver med egen ramme.**

Derfor kan ikke Tom og Ronny bytte uten videre: avdelingene trenger ulik styring.

REGELEN **Mintzbergs fem typer (15.8): myndigheten ligger hos eieren, i reglene, hos fagfolkene, i divisjonene eller i oppgaven.**

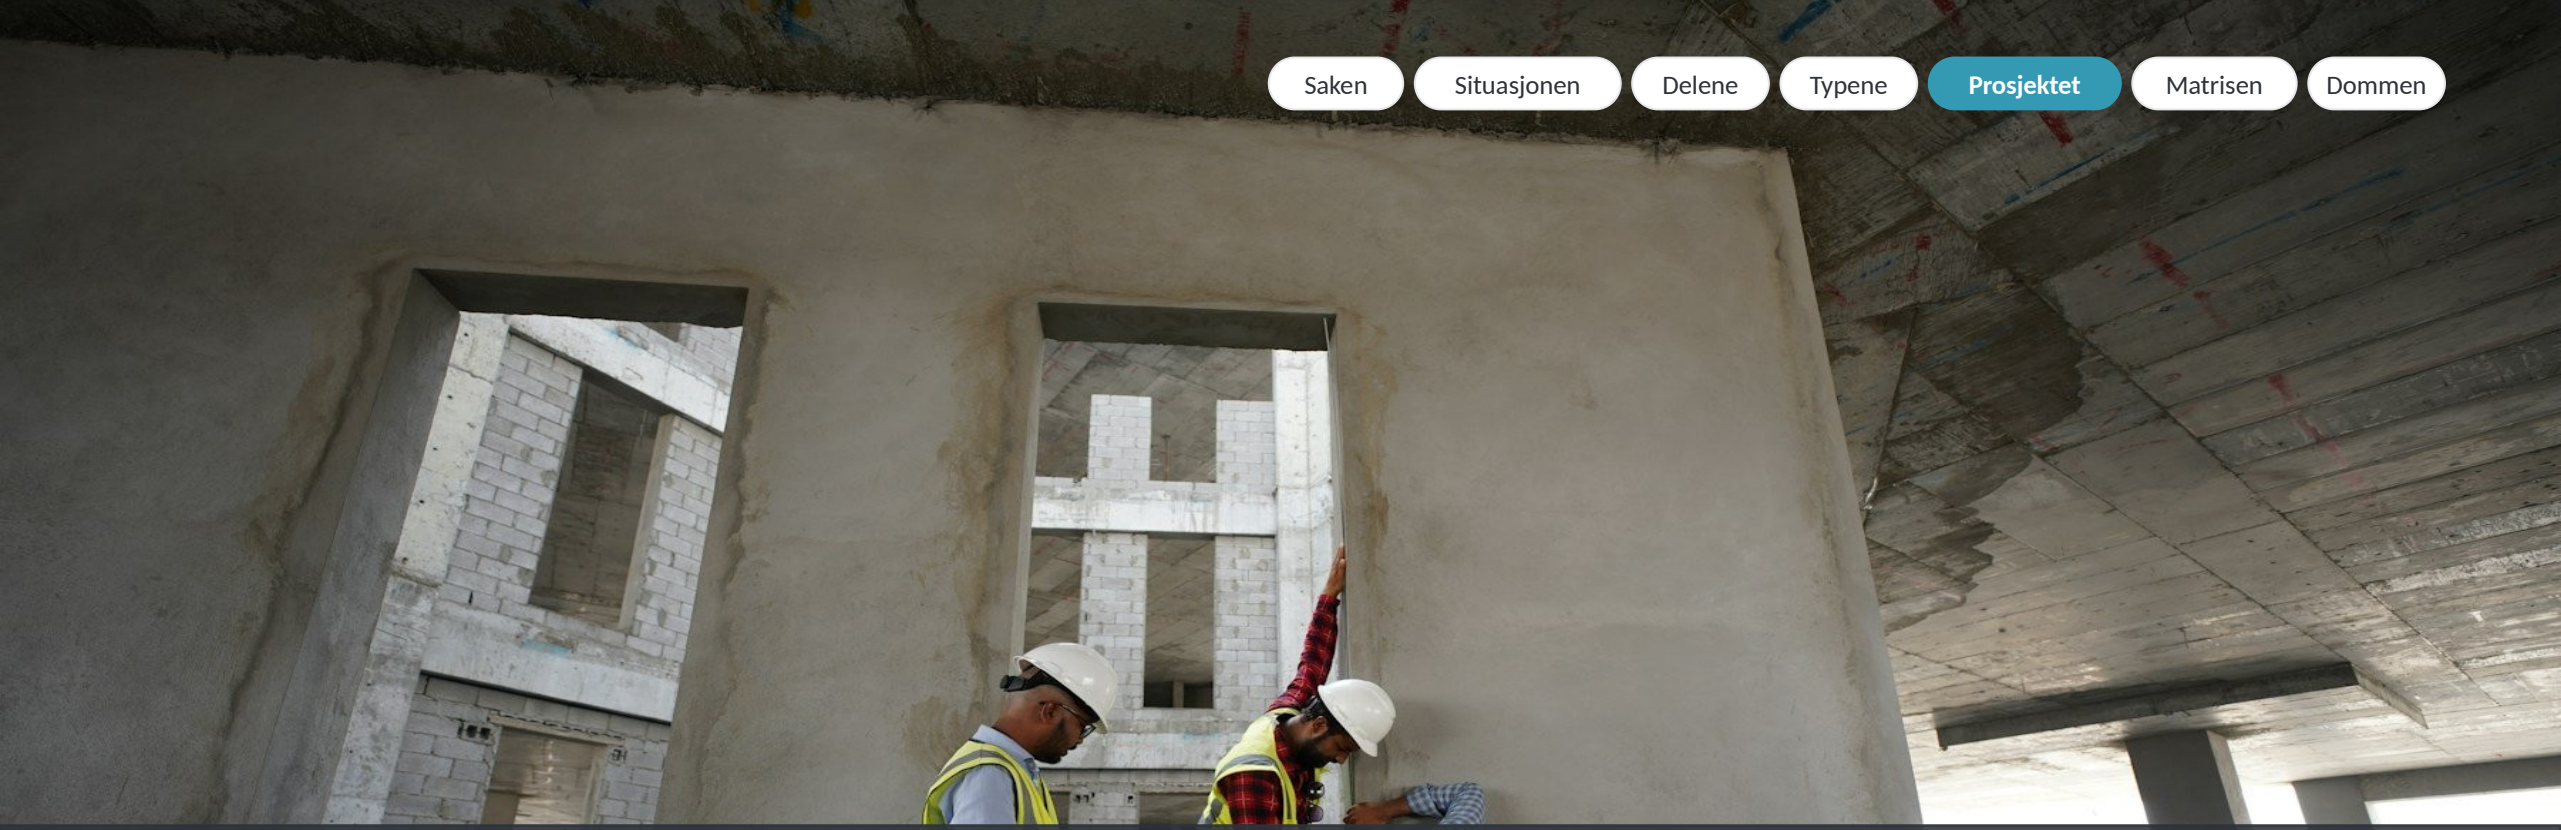

4 · PROSJEKTET: ONSDAG

Nordlys vinner sitt største oppdrag. Det trenger folk fra alle tre avdelingene.

Rehabiliteringen har alle seks kjennetegn

2 400 t

MONTØRTIMER OVER 8 MÅNEDER

Ny hovedtavle, batterilager og lading, med folk fra tre avdelinger.

Seks kjennetegn på en prosjektoppgave

- **Engangsoppgave**
- **Klart mål**
- **Eget styringsobjekt**
- **Tids- og kostnadsramme**
- **Tverrfaglig**
- **Legges ned etterpå**

REGELEN **Prosjekt (15.8.5): en engangsoppgave med klart mål, egen ramme og eget team, som legges ned etterpå.**

Hvem bestemmer over montøren på prosjektet?

A

Linjen

avdelingslederen, som før

B

Prosjektet

prosjektlederen bestemmer alt


C

Begge

og det må avklares før start

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Avdelingen eier faget. Prosjektet eier framdriften

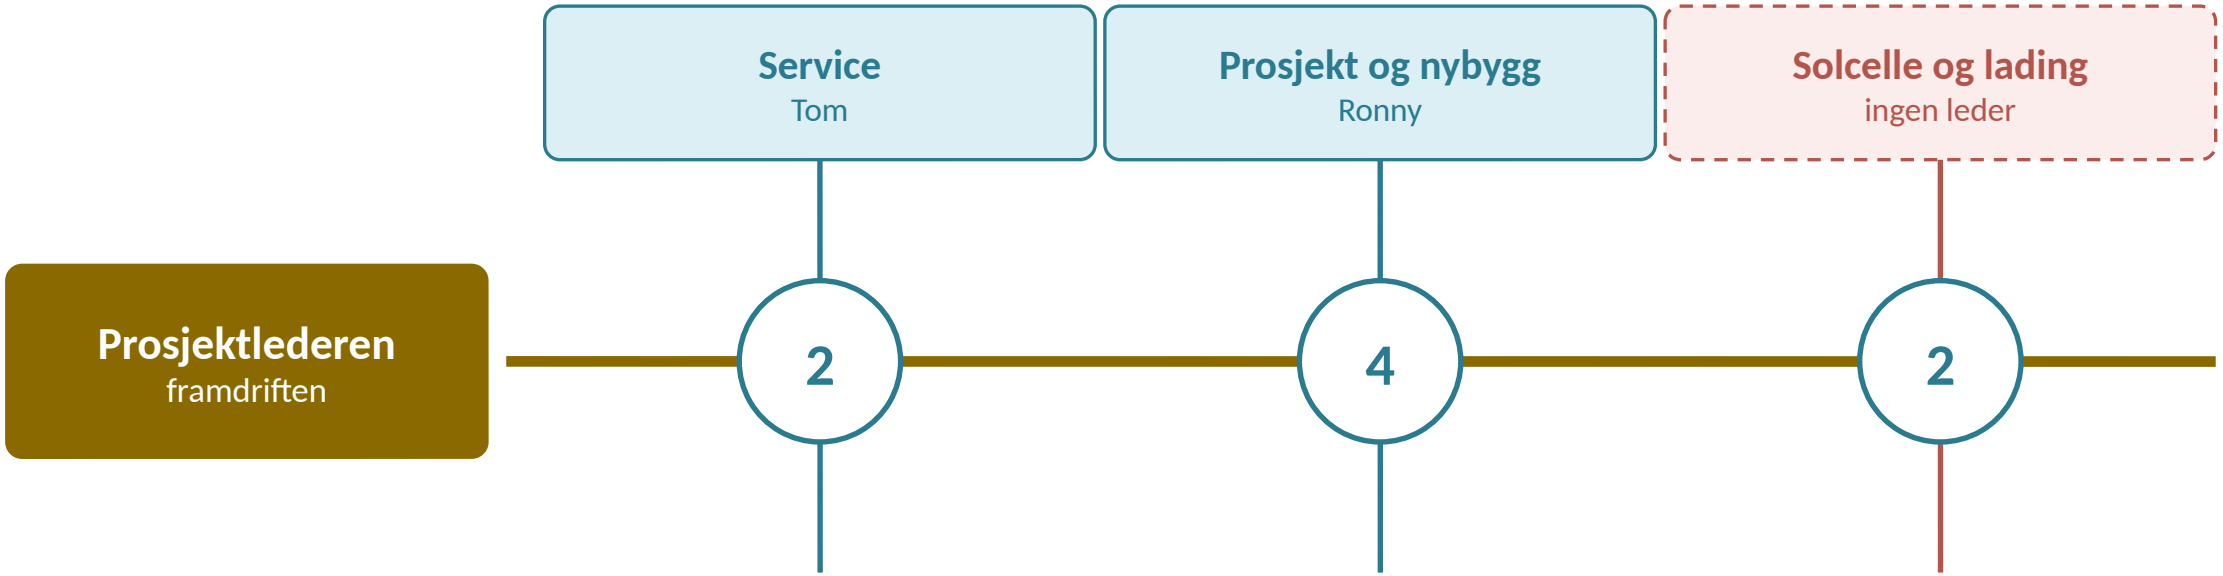

Matrisen bryter med Fayols enhetlige ledelse. Det er greit, så lenge det er bestemt hvem som avgjør.

REGELEN **Matrise (15.8.5): autoritet både vertikalt og horisontalt. Bestem skriftlig før oppstart hvem som avgjør.**

JOBB NÅ

1C

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 15 → Filer → OL15_Nyere_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Nordlys' største oppdrag: hvilken form, og hvem avgjør?

a Plasser fem av bokas eksempler i Mintzbergs typer

b Andelen av Nordlys' timer prosjektet binder

c Andelen av de utførende prosjektet trenger

d Ja eller nei til seks påstander om prosjektet

e Hva kalles strukturen?

f Skriv en anbefaling til styret

Ferdig når

Grønne sjekker i a til e.
I f bruker du ordene prosjektleder og myndighet, og minst ett tall.
Alene, i par eller i gruppe.

16,7 % av timene, 57,1 % av folkene, og en matrise

b · Timene

16,7 %

2 400 / 14 400 × 100

c · Folkene

57,1 %

(2 + 4 + 2) / 14 × 100

e · Strukturen

Matrise

autoritet begge veier

a: kiosk entreprenør, forsikringsselskap maskinbyråkrati, sykehus profesjonelt byråkrati, Equinor divisjon, reklamebyrå innovativ. d: nei på faste regler og én sjef. f: én navngitt prosjektleder med skriftlig myndighet før oppstart.

Nei, og det store oppdraget trenger én som avgjør

133

Én entreprise er like mange timer som 133 serviceoppdrag. Det er to ulike lederjobber.

57,1 %

av de utførende trengs i prosjektet, fra alle tre avdelingene.

1

navngitt prosjektleder med skriftlig myndighet, avklart før oppstart.

SVARET

Svaret til Kari: situasjonen avgjør formen, og en matrise trenger en som avgjør.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 15: 15.6, 15.7 og 15.8.

Arket for økta: alle begrepene med eksempler.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 15 → Øv og Prøv.

Tegn bedriften din i Mintzbergs fem deler.

Kan du forklare ...

Mintzbergs fem variabler, fem deler og fem typer.

Hva som kjennetegner en prosjektoppgave.

Matrise, og hva som må avklares der.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 15. NAV: Bedriftsundersøkelsen 2026. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; timene per oppdrag, akkordlaget, utsagnene, Idas og Monas valg, avviksappen og rehabiliteringsoppdraget er casefakta for kapittel 15. Foto: Unsplash (Andreea Avramescu, Glenov Brankovic).
